

Община = 1 =

„БИЛДПЛАН-08“ ЕООД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

УЛ. ЕЛИН ПЕЛИН 24, ТЕЛ. 087507054, buildplan_08@abv.bg

ОБЕКТ: АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КРАЙБРЕЖНА
ПОДПОРНА СТЕНА ПРЕДСТАВЛЯВАЩА УСТОЙ НА МОСТ
С.ВОНЕЩА ВОДА, ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ




**ЧАСТ: ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО**

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ




ПРОЕКТАНТ:



инж. Петя Христова

УПРАВИТЕЛ:



инж. Мирслав Димитров




ЕООД „ИНВЕСТСТРОЙ-92“

оценяване съответствието
на инвестиционните проекти
и строителен надзор

лиценз № ПК-000435/21.06.2005 г.

гр. В. Търново

дата: 2012 г. подпис: 
инж. Мирслав Димитров

2012 г.

Велико Търново

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
СЕКТОР “ПЪТНА ПОЛИЦИЯ”

Велико Търново, ул. “Беляковско шосе” № 4

Рег. № К – 12961 Екз. №
03.08.2012 г.

С Т А Н О В И Щ Е

от инж. ИВАЙЛО ИВАНОВ ИВАНОВ – ст. инспектор в Сектор “ПП” при
ОДМВР - Велико Търново

ОТНОСНО: Съгласуване на проект за временна организация на движението на обект: “Аварийно възстановяване на пешеходно мостово съоръжение над р. Белица в с. Вонеща вода, Община Велико Търново“.

Настоящото писмено становище се издава на основание параграф 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата.

На основание чл. 4 от Наредба № 3/2010 г. на МРРБ е постъпило искане с вх. № К-15436/03.08.2012 г. от Община Велико Търново за издаване на становище по проект за временна организация на движението на обект: “Аварийно възстановяване на пешеходно мостово съоръжение над р. Белица в с. Вонеща вода, Община Велико Търново”.

Проектът съгласно изискванията на Наредба № 3/2010 г. на МРРБ, подлежи на съгласуване. Представени са обяснителна записка и разработен върху ситуационен план схеми за ВОД.

Изпълнението на СМР е предвидено да се извършва със пълно спиране на движението по мостовото съоръжение.

Съгласно от Наредба № 3/2010 г. работниците, изпълняващи дейността си в обхвата на пътя да бъдат със сигнално работно облекло.

Да се осигури достъп на автомобили със специален режим на движение в участъците с изцяло спряно движение на ППС.

При възникване на проблеми с автомобилното и пешеходно движение, същото да бъде регулирано от обучени за целта работници, снабдени със сигнално облекло и палки.

Проектът за ВОД е разработен при спазване условията на Наредба № 3/2010 г. и отговаря на изискванията на ЗДП за безопасно и безпрепятствено преминаване през работния участък, като същият се съгласува със Сектор "ПП" при ОДМВР – гр. Велико Търново.

На основание чл. 81/1/ от Наредба № 3/2011 г. кметът на Община Велико Търново ще издаде заповед за въвеждане ВОД, в които ще се укаже срокът за действие на ВОД и организацията, която ще възстанови и почисти пътната настилка и тротоарите.

Изпълнителят на строителните работи да издаде Заповед за определяне на отговорно длъжностно лице за поставянето и поддържането на временната сигнализация в съответствие със съгласувания ПВОД и направените забележки.

Строителните работи да започнат след приемане на сигнализацията съгласно ПВОД от представители на Община Велико Търново и сектор "Пътна полиция" при ОДМВР - Велико Търново, като след огледа бъде съставен протокол.



**СТ. ИНСПЕКТОР
В СЕКТОР "ПП" ПРИ
ОДМВР-В. ТЪРНОВО:**

/инж. ИВ. ИВАНОВ/

03.08.2012 год.
Гр. В. Търново

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СЮИЦА № 232

Дата: 22.05.2012

за урегулиране на урбанизиран поземлен имот

в стр. Казартап 2.39А

по плана на трасе 152/153/154/155/156/157/158/159

М 1: 1000

Одобрен със заповед 346.349/1990г

Имота е собственост (зависан) на:

1. _____

2. _____

3. _____

по _____

имотът е собственост

За имот или имоти старти съдебни процедури

Имотът _____ в с площ: _____ Кв.м

УПИ _____ в с площ: _____ Кв.м

Сюицата е в планове с контури на _____ с.л.


За _____ с.л.

Важи за _____

Начертал: *З. Архитект*

Проверил: *М. Кръшкова*

Завършил: _____

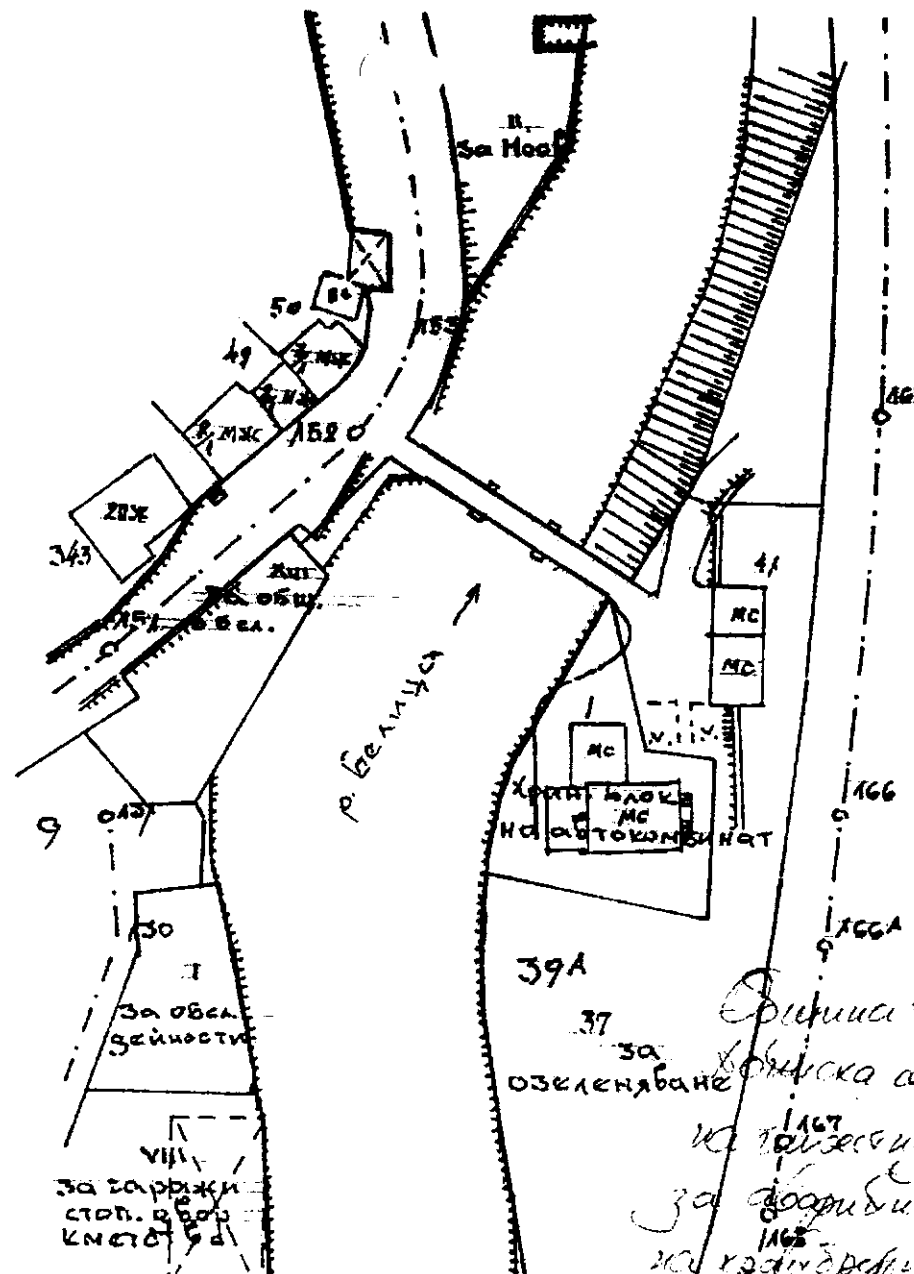

Община - Велико Търново
 Община за урегулиране
 на териториален проект
 за общинско възстановяване
 на териториален проект
 на териториален проект
 на териториален проект

Уличната регулация е (не е) приложена.

За поземлен имот (са уредени; не са уредени; в процес на уреждане)
 За поземлен имот (са уредени; не са уредени; в процес на уреждане)
 За поземлен имот (са уредени; не са уредени; в процес на уреждане)
 За имота има (няма) открити процедури за изменение на път

регулационните отношения с пп
 регулационните отношения с пп
 регулационните отношения с пп

Имотът е (не е) предвиден за изграждането на обект - публична държавна или общинска собственост.....

З. Архитект

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

**ОБЕКТ: АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КРАЙБРЕЖНА
ПОДПОРНА СТЕНА ПРЕДСТАВЛЯВАЩА УСТОЙ НА
МОСТ с.ВОНЕЩА ВОДА,ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧАСТ: ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Велико Търново

) Настоящият проект за временна организация на движението се изготви по искане на възложителя във връзка с извършване на аварийно възстановителни работи на подпорна стена, представляваща устой на мост в урбанизираната територия с. Вонеща вода. Проектирана е съгласно Скица № 92/20.05.2012г. и виза от Главен архитект на Община Велико Търново

Проектирано е ново укрепващо крайбрежно съоръжение стоманобетонова подпорна стена с височина от 6,20м с фундамента. Пред нея ще се изпълни предпазна каменна стена с циментов разтвор. За укрепването на улицата ще се изпълнят и 12броя изливни стоманобетонowi пилоти с диаметър Ф400, който в горния си край ще бъдат обхванати от ростверк с размери 50/60см.

) Пешеходното и автомобилното движение в участъка е с ниска интензивност.

Строителството ще се изпълнява, чрез сигнализиране на дълготрайни ремонтни работи без отбиване на движението. Временната организация на движение е проектирана, съгласно приложение №53 към чл.71 ал.1 т.4 от Наредба № 3/16.08.2010г двулентова двупосочна улица с работен участък върху едната пътна лента с дължина по-малка от 50м. За осигуряване на безопасност са предвиден допълнително знак В24 – забранено изпреварването. По време на работа при нужда регулирането на движението да става от инструктирани работници с палки. Пешеходното движение по моста ще се спира по преценка на Възложителя.

Изработени са :обзорна карта и детайл по време на извършване на СМР.

По време на работа в участъка не се допуска престой и паркиране на автомобили. Вечер обекта задължително трябва да се осветява, а изкопът да се обезопасява.

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОООД „ИНВЕСТСТРОЙ-92“
оценяване съответствието
на инвестиционните проекти
и строителен надзор

лиценз № ЛК-000435/21.06.2005г.

Техническият проект ВОБД е изготвен съгласно чл.76, ал.3 от Наредба № 3 от 16.08.2010 за временната организация на движението и извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обнародвана в ДВ от 21.09.2010г. След избор на изпълнител, преди започване на дълготрайните СМР ще се представи и линеен график за изпълнение от фирмата строител. Работният проект ще се въвежда по реда на чл.81 от Наредба №3/2010г.

Знаците предвидени за временната сигнализация са стандартни светлоотразителни II типоразмер и отговарят на изискванията на БДС 1517:2006 „Пътни знаци. Размери и шрифтове“. Те трябва да се монтират стабилно за цялото времетраене на строителството. Ако има знаци от постоянната сигнализация в противоречие с временната се изолират, покриват се с калъфи.


Веднага след приключването на строителните работи знаците трябва да се приберат, а движението да се възстанови в нормалния си вид. По време на строителството да не се замърсяват и закалват уличните настилки, като при допускане на такива да се почиства своевременно. След завършване на строителството околното пространство да се почисти.

Лицата, които извършват строителни работи в обхвата на пътя да носят облекло с ярък цвят и светлоотразителни ленти, съгласно чл.6 от Наредбата №3


Строителя се задължава да уведоми Противопожарната служба, Бърза помощ и ОДП за дните в които движението в участъка ще бъде затруднено.


Проектът за ВОБД да се съгласува със ОД МВР Сектор Пътна полиция гр.Велико Търново, Община Велико Търново и АПИ- Областно пътно управление гр.В.Търново

Проекта е изработен спазвайки изискванията на Закона за движение по пътищата и Наредба №3/16.08.2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на СМР по пътищата и улиците, Наредба №2/2001г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, Наредба №1/2001г. за организация на движението и Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР



Съставил:



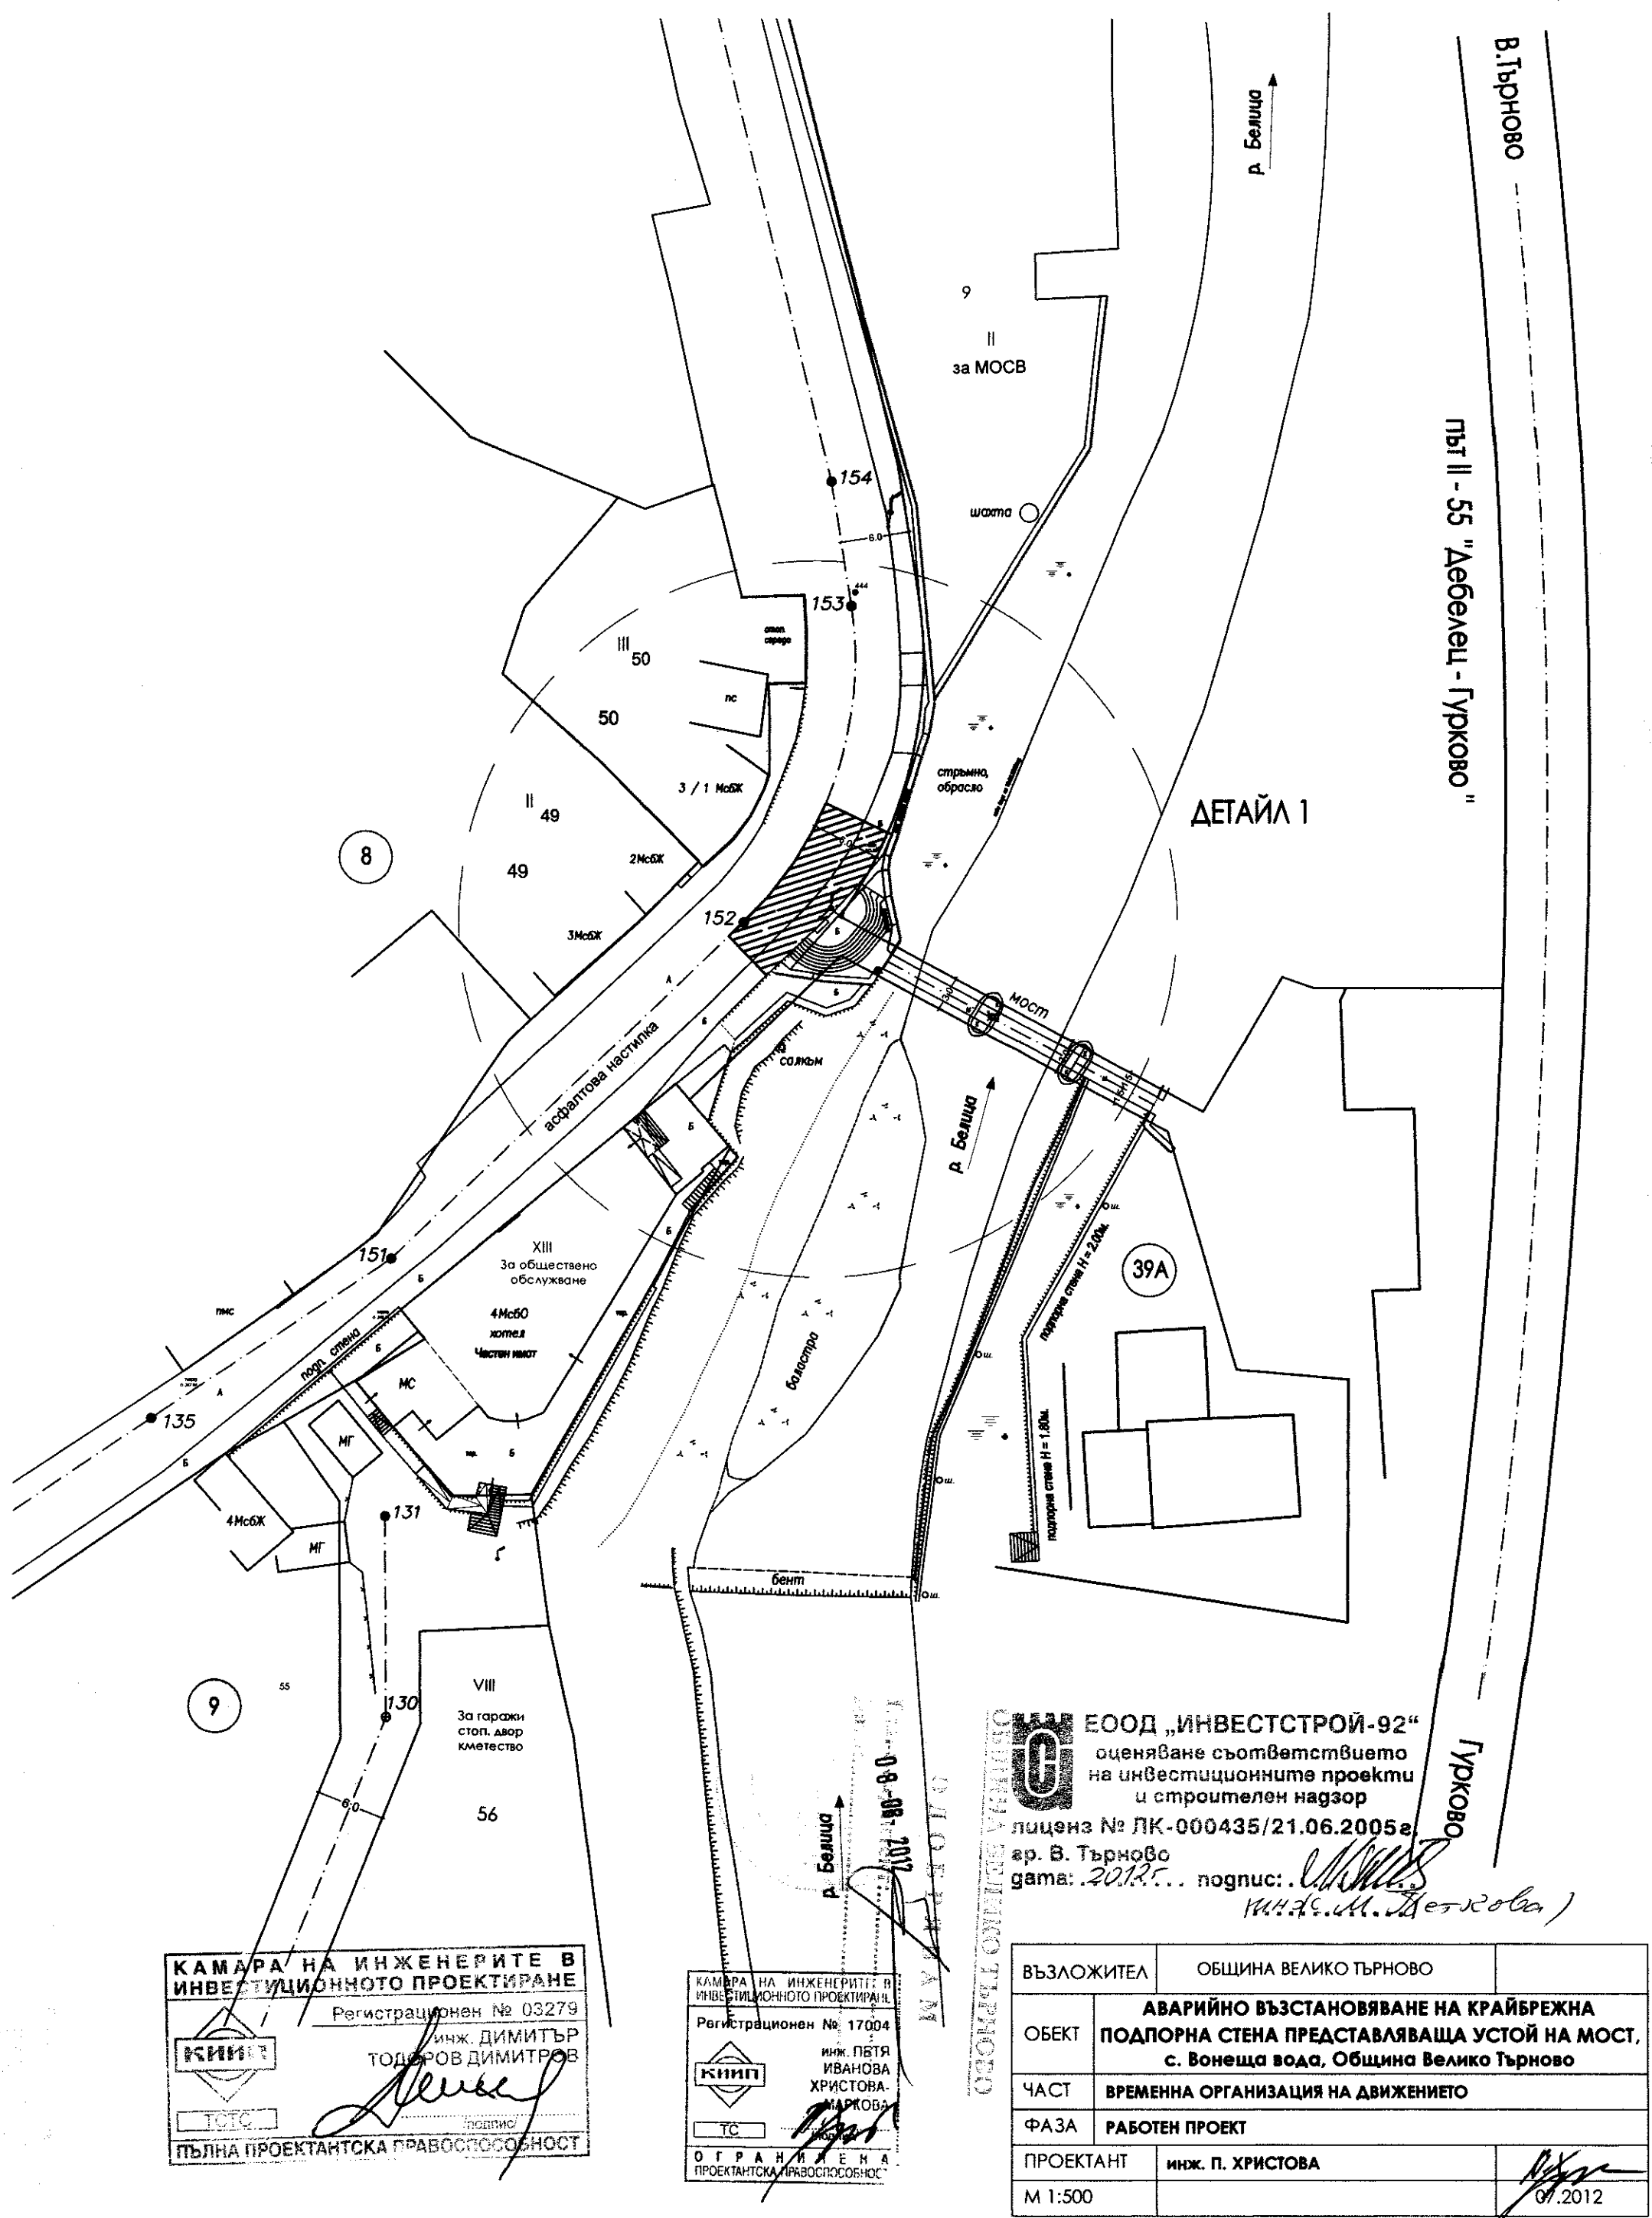

ДЕТАЙЛ 1

ЕООД „ИНВЕСТСТРОЙ-92“
оценяване съответствието
на инвестиционните проекти
и строителен надзор

лиценз № ЛК-000435/21.06.2005г.
гр. В. Търново
дата: 2012 г. подпис: *[Signature]*

[Signature]

Становище с рег. № К-12961/03.08.12г.

с. инж. *[Signature]*

ОБЩИНА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Дирекция ТСУ

СЪГЛАСУВАМ

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ *[Signature]*

Дата: 03.08.2012 г.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 03279

ИНЖ. ДИМИТЪР
ТОДОНОВ ДИМИТРОВ

ТОДОНОВ ДИМИТРОВ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОДОБРЯВА

Дата: 08-08-2012

Регистрационен № 17004


ИНЖ. ПЕТЯ
ИВАНОВА

ХРИСТОВА

МАРКОВА

ОГРАНИЧЕНА
ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОБЕКТ	АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КРАЙБРЕЖНА ПОДПОРНА СТЕНА ПРЕДСТАВЛЯВАЩА УСТОЙ НА МОСТ, с. Вонеща вода, Община Велико Търново
ЧАСТ	ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
ФАЗА	РАБОТЕН ПРОЕКТ
ПРОЕКТАНТ	ИНЖ. П. ХРИСТОВА
М 1:500	07.2012

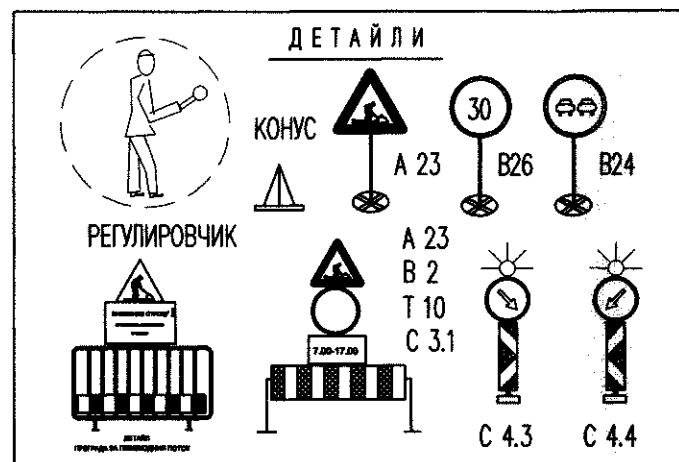

ЗАБЕЛЕЖКА :

ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА ПРИ НУЖДА РЕГУЛИРАНЕТО
НА ДВИЖЕНИЕТО ДА СТАВА ОТ ИНСТРУКТИРАНИ
РАБОТНИЦИ С ПАПКИ И ПОДХОДЯЩО ОБЛЕКЛО !

ПЕШЕХОДНОТО ДВИЖЕНИЕ ПО МОСТА
ЩЕ СЕ СПИРА ПО ПРЕЦЕНКА НА СТРОИТЕЛЯ !

