

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРОТЕХНИКА ЕВЕНТ” ЕООД, гр. София**

**ПРЕДМЕТ: "Услуга по прожектиране на триизмерна проекция - 3D мапинг спектакъл "Величието на Асеновци" в района на "Паметник Асеновци" и върху сградата на ХГ "Борис Денев"**

## **ДОГОВОР**

**На основание чл. 101е, ал.1 от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП**

Днес 21.03.....2015 г. в град Велико Търново, между:

**1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**, наричана по-долу **"ВЪЗЛОЖИТЕЛ"**, с адрес: град Велико Търново, пл. "Майка България" № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ – Кмет на Общината, от една страна

и

**2. „ПРОТЕХНИКА ЕВЕНТ” ЕООД, гр. София**, наричано по-долу **"ИЗПЪЛНИТЕЛ"**, със седалище и адрес: гр. София 1528, бул. „Искърско шосе” № 7, ТЦ Европа”, бизнес сграда 10, ет. 1, тел: 0888/602 744, e-mail: protechnicaevent@gmail.com, БУЛСТАТ/ЕИК: 131057484, представлявана от управителите Пламен Валентинов Босев и Милена Димитрова Лазарова, от друга страна

**СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:**

### **I. ПРЕДМЕТ, ЦЕНИ И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

Чл.1(1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши услуга по прожектиране на триизмерна проекция - 3D мапинг спектакъл "Величието на Асеновци" в района на "Паметник Асеновци" и върху сградата на ХГ "Борис Денев, съгласно представената оферта, неразделна част от настоящия договор.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши възложената услуга с обем и характеристики, съгласно представената оферта и указанията на възложителя.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да извърши възложената работа на свой риск със свои ресурси и персонал.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи заплащане за извършени работи, ако са в следствие на:

1. Несъгласувано с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** отклонение от указанията на представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

2. Нарушаване на законодателството във връзка с извършваната дейност.

3. Отстраняване на допуснати от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** недостатъци на извършените работи.

**Чл.2 Срока на изпълнение на събитието – 22.03.2015 г. с начален час на започване – 19:00 часа.**

Чл.3(1) Извършената работа се удостоверява с протокол, подписан от Изпълнителя и представител на Възложителя.

*"Услуга по проектиране на триизмерна проекция - 3D матинг спектакъл "Величието на Асеновци" в района на "Паметник Асеновци" и върху сградата на ХТ "Борис Денев"*

(2) Липсата на изпълнение или каквато и да е форма на неизпълнение от страна на Изпълнителя, се удостоверява с двустранно подписан протокол между страните, а при отказ от страна на Изпълнителя – с констативен протокол, подписан от двама свидетели.

Чл.4(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ получава възнаграждение, съгласно представената оферта, неразделна част от договора: **65 903,00 /шестдесет и пет хиляди деветстотин и три и 00ст./ лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 79 083,60 /седемдесет и девет хиляди и осемдесет и три лева и 60ст./ лева.**

(2) Възнаграждението се заплаща, както следва:

- аванс – **30 %** от общата стойност на поръчката след сключване на договора
- окончателно плащане в срок **до 30 /тридесет/ дни след одобряване на фактурата.**

## **II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

Чл.5(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да подсигури средства за разплащане на извършената услуга по договора и да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно постигнатите договорености.

(2) Възложителят е длъжен :

1. да укаже мястото на изпълнение на възложеното с този договор;
2. да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до мястото на изпълнение на възложеното с този договор;
3. да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършената услуга, ако тя отговаря на необходимото качество.
4. чрез свой представител да участва при подписване на протокола за изпълнението на възложеното с този договор;
5. при точно и пълно и изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена.

Чл.6(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да изисква в определен от него срок, и да получава отчетна информация относно хода на изпълнение на настоящият договор и да следи за спазването на нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи услугата във вида и срока, указани от неговите представители.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възложи при необходимост нови условия за изпълнение на услугата по чл.1, за което уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## **III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

Чл.7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение, при точно и пълно изпълнение на задълженията си по този договор.

7.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже представянето на триизмерната проекция, без да носи отговорност за това, при възникнала непреодолима сила и форсмажорни обстоятелства, непозволяващи нормалното провеждане на триизмерната проекция, като преди това своевременно уведоми Възложителя за това.

7.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на работата.

Чл.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- 8.1 да положи необходимата грижа за качествено извършване на услугата - да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- 8.2 да изпълни работата така, че тя да бъде годна за предвиденото в договора предназначение и отговаря за доброто качество на същата.
- 8.3 стриктно да се придържа към предмета на поръчката, както и да спазва всички указания, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- 8.4 да извърши услугата в уговорения вид и срок;
- 8.5 да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор;
- 8.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гарантира, че няма да разпространява на трети лица факти, данни, обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и станала му известна по време и във връзка с изпълнението на този договор.

Чл.9(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури извършването на услугата в посочения в чл. 2 срок.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя информация за хода на работата и стадият на изпълнението при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ.

Чл.10 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да участва и съдейства за своевременното съставяне и подписване на протоколите за изпълнението по договора.

Чл.11 Разпорежданията на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.12 Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи не подлежат на заплащане.

Чл.13(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на изпълнението на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва действащото в страната законодателство, касаещо предмета на поръчката, техниката на безопасността на труда.

(2) При неизпълнение на задълженията по този договор или произтичащи от закона, както и при неточно изпълнение, поради причини за които някоя от страните отговаря, неизправната страна носи отговорност съобразно чл. 79 - 98 от Закона за задълженията и договорите.

Чл.14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор.

Чл.15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на работата е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, от изисквания, задължителни съгласно нормативни актове или от указанията на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

#### **IV. ПРИДОБИВАНЕ НА ИСКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ**

Чл.16(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстъпва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ авторските права върху създадения видео материал на триизмерна проекция, както и върху музиката,

*"Услуга по прожектиране на триизмерна проекция - 3D мапинг спектакъл "Величието на Асеневици" в района на "Паметник Асеневици" и върху сградата на ХГ "Борис Денев"*

композирана и записана специално за спектакъла, както и върху реализираната проекция, проведена в град Велико Търново на дата 22.03.2015г.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че притежава прехвърляните авторски права по чл.16, ал.1 от настоящия договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че той лично е създател на произведенията по чл. 16, ал. 1, че не имал за цел или не е допуснал съзнателно копиране или груба имитация на чужди произведения.

Чл.17(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстъпва за срок от 10 години на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изключително право на ползване на създадения видео материал със заснет 3D спектакъл, както и на музиката, композирана и записана специално за спектакъла, както и върху реализираната проекция, проведен в град Велико Търново на дата 22.03.2015 г.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ от датата на подписване на настоящия договор не може да използва създадения видео материал със заснет 3D спектакъл, както и в музиката, композирана и записана специално за спектакъла, нито да отстъпва това право на трети лица.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстъпва правата си в чист вид, без юридически тежести и претенции на трети лица за авторство или за добити от тях по какъвто и да е начин права върху произведенията на територията на действие и по време на действие на този договор.

Чл.18(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да използва и разпространява по всякакъв начин създадения видео материал със заснет 3D спектакъл, както и музиката, композирана и записана специално за спектакъла. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставя изключителното право на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ползва създадения видео материал със заснет 3D спектакъл, както и музиката, композирана и записана специално за спектакъла, както на територията на Република България, така и извън страната.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е длъжна да изисква съгласие или разрешение за всяко конкретно използване на произведенията по чл. 16, ал.1. и може да преотстъпва отстъпените му с този договор права и на други лица.

Чл. 19(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отстъпва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, правата по този договор в рамките на възнаграждението по чл.4, ал.1. Възнаграждението се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път след одобряване на фактура.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи други възнаграждения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предоставеното изключително право на ползване.

Чл.20 Изключителното право на ползване се отстъпва за срок от 10 /десет/ години, считано от датата на сключване на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ползва правата през 10 годишния срок. С изтичане на срока от 10 години изключителното право автоматично се преотстъпва за нов 10/десет/ годишен период. За всеки следващ 10 /десет/ годишен период ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изключителното право на ползване за произведенията по чл. 1, ал.1 и чл. 16, ал.1 безвъзмездно.

Чл.21(1) При нарушаване на авторските и сродните права, произтичащи от българските закони и международни конвенции, по които България е страна, при упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ носи отговорност спрямо онзи, чиито права са нарушени в съответствие с действащото законодателство, включително за неимуществени и имуществени вреди, настъпили в резултат на нарушението. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплати вреди във връзка с авторски права върху произведенията по чл. 16, ал.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжна да й възстанови заплатените средства в срок указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предприема всички необходими мерки за безпрепятственото упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придобити с този договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще възстанови всички разходи на Община Велико Търново, ако последната направи такива по повод удовлетворяване на претенции от заинтересовани лица по Закона за авторските права и сродните му права. Разходите се възстановяват в писмено определен от Община Велико Търново срок.

(4) Страните си дължат информация за състоянието на авторските и сродните права по този договор, за нарушенията им, за защитата и исковете, които предприемат във връзка с тях, както и за всеки друг юридически въпрос свързан с предмета на този договор. При нарушаване на това свое задължение те носят отговорност за непозволено увреждане.

## **V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ**

Чл.22(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на своите работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, включително и когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вреди, причинени то трети лица по време и по повод изпълнението на възложената работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложеното с необходимата грижа, ефективност добросъвестност в съответствие с най-добрите практики за дейността, като за целта мобилизира необходимите за това финансови, човешки и материални ресурси.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако извършената работа има недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор да иска съответно намаление на възнаграждението или да търси/удържи неустойка от него в размер на 10 % от стойността на възложеното.

(5) Ако стане ясно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да изпълни възложеното или няма да го изпълни в уговорения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора с писмено предизвестие и да търси неустойка в размер на 10 % от стойността на възложеното, независимо от размера на действително претърпените вреди. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение.

(6) В случай на непровеждане на триизмерната проекция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение. Наред с това ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на възложеното, независимо от размера на действително претърпените вреди, в писмено определен от Възложителя срок.

(7) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение и на заплащане на разходите по изпълнението и дължи връщане на авансово получени суми по договора, в случай на получени такива в писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок.

Чл.23 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси/удържи неустойка в размер на 10 % от стойността на възложеното, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. при извършване на възложените работи се е отклонил съществено от уговореното в този договор;
2. извършил е възложените работи с много ниско качество;
3. при извършване на възложените работи се отклонил от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. не е изпълнил други задължения по договора.

Чл.24 При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същата ще се третира от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като отказ от изпълнение по договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

*"Услуга по прожектиране на триизмерна проекция - 3D мапинг спектакъл "Величието на Асеневици" в района на "Паметник Асеневици" и върху сградата на ХГ "Борис Денев"*

прекратява договора с писмено предизвестие и може да търси неустойка в размер на 10 % от стойността на възложеното.

Чл.25(1) Некачествено изпълнение на работите от страна на Изпълнителя, липсата на изпълнение или друго неизпълнение по договора се удостоверява с двустранно подписан протокол между страните, а при отказ от страна на Изпълнителя - с констативен протокол /подписан от двама свидетели/ и представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Санкциите и неустойките, предвидени в този договор, не отменят правото на изправната страна по договора да търси обезщетение от виновната страна за претърпени вреди във връзка с неизпълнение на условията и/или разпоредбите на този договор, надвишаващи размера на неустойката.

## **VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

Чл.26(1) Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. По взаимно съгласие.

2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна заплаща дължимите поради забавеното или некачествено или друго неизпълнение неустойки в 3 /три/ дневен срок от прекратяване на договора.

3. С изпълнение на възложеното с договора и заплащане на възнаграждението.

4. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с писмено предизвестие, като заплаща действително извършената работа до момента на прекратяването.

(2) При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият връща предоставения аванс, ако такъв е предоставен, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане на възнаграждение и разноски. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение в размер на законовите лихви от дължимата сума /авансово получената сума/, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я върне в определеният от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок.

(3) Във всички случаи на прекратяване или разваляне на договора поради неизпълнение от страна на Изпълнителя, той няма право на възнаграждение и дължи връщането му. Наред с това ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на възложеното до момента, в писмено определен от Възложителя срок, освен ако неизпълнението се дължи на непреодолима сила. При забава на дължимите суми се дължи законна лихва.

## **VII ДРУГИ УСЛОВИЯ**

Чл.27 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

Чл.28 Нищожността на някоя от клаузите на договора или на допълнително уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

"Услуга по проектиране на триизмерна проекция - 3D мапинг спектакъл "Величието на Асеневици" в района на "Паметник Асеневици" и върху сградата на ХГ "Борис Денев"

Неразделна част от настоящия договор е представената оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Този договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**Инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ**  
Кмет на Община Велико Търново

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Илка Годорова

Гл. счетоводител в дирекция „Култура и туризъм“

Съгласуван с:

Десислава Йонкова

Директор на дирекция „Изравна“

Надя Петрова

Директор на дирекция ОСОП

Нелина Църова

Директор на дирекция „Култура и туризъм“

Инж. Динко Кечев

Директор на дирекция СУТ



## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящата оферта е подадена от „**ПРОТЕХНИКА ЕВЕНТ**“ ЕООД  
и е подписана от **Пламен Валентинов Босев**, с ЕГН ' ' в качеството му на  
Управител на „Протехника Евент“ ЕООД,

*Уважаеми членове на Комисията,*

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: „Услуга по прожектиране на триизмерна проекция - 3D мапинг спектакъл „Величието на Асеневици“ в района на „Паметник Асеневици“ и върху сградата на ХГ „Борис Денев“ при условията, посочени в публичната покана и приети от нас.


2. Приемаме да се считаме обвързани от предложенията направени с офертата, до изтичане на **2 (два) месеца**, считано от крайния срок за получаване на офертата.

3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълняваме качествено поръчката в пълно съответствие с направените от нас предложения **на дата 22.03.2015 г., с начален час – 19:00 часа**. Задължаваме се да изпълняваме услугата в съответствие с условията на предложен от Вас договор.

**4. Техническо предложение, съобразно изискванията по показател Т-техническа оценка от методиката за оценка на офертите:**

Настоящият документ е разработен, съгласно изискванията за изпълнение на дейностите, включени в обекта на обществената поръчка, разписани на Възложителя в Публичната покана, при стриктно спазване на условията и спецификите, поставени към техническите и функционални характеристики на професионалната техника и оборудване, специфицирани в Техническото задание (спецификация) – приложение към одобрената от Кмета на Община Велико Търново публична покана и при съблюдаване на показателите за оценка, обосноваващи изискванията на Възложителя за съдържание на предложената от Участниците в процедурата организация и методология на изпълнението.

Основна цел на настоящата организация и методологията е задълбочено представяне на разбирането на Участник „**ПРОТЕХНИКА ЕВЕНТ**“ ЕООД на обхвата и същността на изискванията на Възложителя към изпълнението на възлаганите дейности по техническо обезпечаване на събитията и мероприятията, провеждани от Община Велико Търново, квалифицирани от Възложителя като „услуга по прожектиране на триизмерна проекция - 3D мапинг спектакъл „Величието на Асеневици“ в района на „Паметник Асеневици“ и върху сградата на ХГ „Борис Денев“, от една страна, а от друга, представя визията на Участника относно:

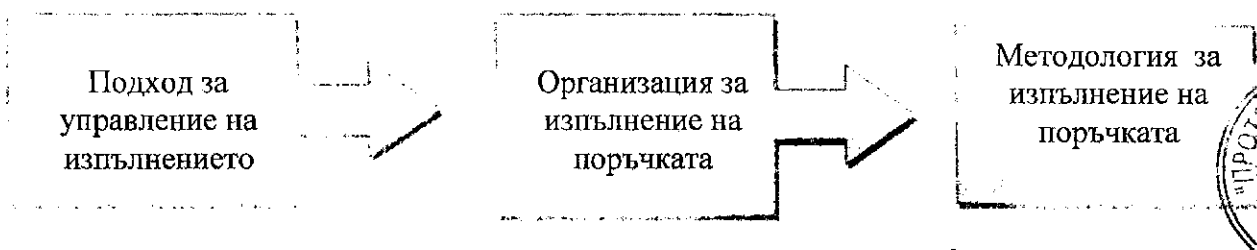



В настоящата Организация и методология, „ПРОТЕХНИКА ЕВЕНТ“ ЕООД предлага своята концепция, относно извършването на конкретните дейности по предоставяне на техническа подкрепа на Възложителя при провеждане на събитието – празник на гр. Велико Търново, характеризиращ се с широк обществен интерес, посредством разработване на идейните проекти по продукцията, реализация на лазерно шоу, триизмерна проекция, анимация, мапинг, изграждане на сцени, доставка, монтаж и последващо техническо обслужване на необходимата за конкретното събитие професионална осветителна и озвучителна техника и оборудване за изпълнение на посочените дейности, обобщоформулирани като 3D мапинг спектакъл.

Дружеството ни е силно заинтригувано от обявената от Община Велико Търново обществена поръчка, предвид обстоятелството, че изпълнението на отделните дейности, включени в обхвата ѝ, следвани логично от пълно и всеобхватно постигане на общата ѝ цел за придаване облик на град Велико Търново на културно средище, с ефектно и запомнящо се събитие и мероприятие, е предизвикателство за осъществяване и прилагане на знания, компетентност, опит, съответно – оказване на висококвалифицирана подкрепа на Възложителя за постигане на поставените цели, която експертна помощ очертава основната сфера на осъществяваната от „Протехника Евент“ ЕООД основна дейност.

Нашето дълготрайно присъствие в нишата на Дружествата, занимаващи се с доставка, монтаж и техническо обезпечаване на *професионални системи за озвучаване, системи за художествено сценично осветление, видео и мултимедийни системи, както и изготвяне на сценарии и пресъздаване на триизмерни мултимедийни проекции*, ни позволява да оценим в пълнота предизвикателствата, представени в целите на тази покана. Документното предложение има за цел да представи нашите квалификации относно избора ни за Изпълнител при реализацията на индивидуализираните дейности, предмет на поръчката, възлагани от Община Велико Търново.

#### ***Представяне на Участника:***

„ПРОТЕХНИКА ЕВЕНТ“ ЕООД е Търговско Дружество, регистрирано през 2003г. с цел техническо и художествено обезпечаване на реализацията на:

- ***Забавни телевизионни предавания*** като „България търси талант“, „Гласът на България“, „Х - фактор“, „Като две капки вода“, „Стани богат“, „Пей с мен“, „Денсинг Старс“, „Биг Брадър“ и множество аналогични шоу предавания;

- ***Телевизионни сериали***, като: „Забранена любов“, „Стъклен дом“, „Под прикритие“ и др.

- ***Кино продукции и филми*** като: „Мисия Лондон“, „Конан“ и др.

- ***концертни и шоу програми, излъчвани на живо*** от типа на турнета на Слави Трифонов в страната, концерти на телевизия „Планета“. предаването „Срещу новините“ (БНТ) и др.

- ***3D видео мапинги*** на открито и в зала;

- ***други събития и продукции*** с идентичен характер

„Протехника евент“ ЕООД е българска компания, специализирана в изпълнение на широкомащабни и комплексни дейности като: проектиране, доставка, монтаж, системната интеграция и техническо обезпечаване на събития на открито и в зала, с професионални системи за озвучаване, системи за художествено сценично и ефектно осветление, видео и мултимедийни системи и др. Дружеството ни е натрупало богат практически опит и е реализирало разнообразни по обем и сложност мероприятия и предавания, предоставяйки самостоятелни услуги като:

- ***художествено осветление и дизайн;***

- **мултимедия и виртуален декор** (комплекс от едроформатни LED екрани, дисплеи, проекции – неразделен елемент от декора на всяко модерно студио) както и съответното **мултимедийно съдържание (контент)**;

- **озвучителна техника, аудио или видео оборудване, техническо обслужване и тонрежисура**;

- **сценични конструкции и декори**;

- както и **комплекс от тези услуги**, обединени в цялостно решение в съответствие с конкретните изисквания на Възложителя и съответната негова идея, която Дружеството превръща в реален и едновременно с това – уникален по характера си продукт (събитие, шоу предаване и/или концерт).

Основният си пазарен дял и трайно позициониране на регионално, национално и международно ниво, както и конкурентоспособността на изпълняваните от него услуги, Дружеството дължи на изпълняваните с висок професионализъм и безспорно качество дейности с предметен обхват, посочен по-горе.

От самото си регистриране, Дружеството работи съвместно с почти всички телевизии и продуцентски къщи, развиващи подобна дейност на българския пазар (както на регионално така и на национално ниво). Доказателство за постигнатите резултати е списъка на основни клиенти, между които са „Българска Национална Телевизия“ (БНТ), „БТВ Медия груп“ АД, „Нова ТВ“, „Медиа Про“, „Глобал филмс“, „Ню Бояна“ ЕАД, „СИА адвъртайзинг“, „Седем – Осми“ ЕООД, „OLD School“, „Ноу Фрейм медия“ АД, „ТВ 7“, „МСАГ“, Телевизия „Планета“ и др.

Към момента Дружеството е сред водещите в бранша, благодарение на иновативния си подход, високото качество на предлаганите продукции и висококвалифицирания си екип от специалисти.

Едновременно, „Протехника Евент“ ЕООД е отворено и за нови дейности, нетипични и различаващи се от установените практики на работа, като част от фирмената политика на Дружеството е да търси проекти с повишена сложност и изисквания, както по отношение на използваните технически средства, така и от гледна точка на компетентността и уменията на необходимия човешки ресурс. Маркетинговата стратегия на Дружеството включва непрекъснато увеличаване на пазарния дял, чрез въвеждане на новости и иновативни технологии и предоставяне на услуги, съответстващи по качество на тези в най-напредналите в областта Дружества в световен мащаб, като по този начин постига и разширяване на пазара на услугите си, генерирайки нови нужди (потребност от нов вид услуги) на пазара. Ясно доказателство за това е факта, че от няколко години, дружеството се опитва и безспорно успява да изнесе част от дейността си и на външни пазари. Налице са успешно реализирани проекти в Гърция, Румъния, Косово и Македония.

### **Организация на работата**

„Протехника Евент“ ЕООД разполага със собствен екип от над 30 души, специализирани в монтажа, интегрирането и техническото обезпечаване на предлаганите от нас системи и разполага с всички необходими технически средства и съоръжения, необходими за реализирането на монтажните дейности и техническо обслужване. Всеки един от нашите специалисти е много добре запознат с предлаганите от нас продукти, участвал е нееднократно в доставката, монтажа, интегрирането и техническото обслужване на предлаганото от нас оборудване при обезпечаване провеждането на мероприятия с масов характер и е напълно наясно с дейностите, които следва да се извършат в процеса на изпълнение на тези дейности, едновременно с което всеки един от работещите в Дружеството експерти е професионалист, притежаващ необходимите за този вид дейност умения за бързо и адекватно реагиране в зависимост от конкретиката на събитието. Дружеството разполага с едни от най-добрите специалисти в областта на озвучаването.

осветлението и мултимедията, с дългогодишен практически опит, доказана репутация и авторитет.

„Протехника Евент“ ЕООД като участник в процедурата, отговаря самостоятелно, за цялостното управление и изпълнение на договора, съгласно изискванията заложи в Публичната покана, цялостната координация с основните експерти, Възложителя и лицата, заинтересовани от изпълнението на отделните мероприятия. Дружеството носи обща отговорност за контрола на качеството и постигането на заложените резултати.

*!!! Предвид, обаче направеното от Възложителя описание на дейностите, подлежащи на изпълнение, за нас е налице ясното разбиране, че съобразно конкретиката на подлежащия на техническо обезпечаване евент (в което число и мястото на изпълнение, времето, необходимо за неговото организиране, обема и характеристиките на техниката и оборудването за целите на конкретното възлагане), организацията на работа, предвидените технически и човешки ресурси подлежат на промяна, допълване и реорганизация, в съпоставка с представената по-долу стандартизирана система за работа.*

*Имайки предвид посоченото сме предвидили всички рискове и имаме готовност за бърза, навременна и адекватна реакция, независимо от вида и характера на необходимата организационна промяна.*

Организацията на работа по обезпечаване провеждането на мероприятията от Дружеството, която предвиждаме да следваме, в случай, че бъдем избрани за изпълнител на поръчката и Община Велико Търново ни възложи изпълнението на договора, ще се развива **в следния технологичен порядък от взаимно свързани етапи на изпълнение:**

↓ **Разработване на идейна концепция** за реализация на мероприятията в частите: художествено осветление, звук, мултимедия и декори (по конкретна част или комплексно), ориентирана към постигане на максимално художествено въздействие в съответствие с режисьорското виждане и най-новите технически достижения в областта.

↓ **Представяне на проекта** на Възложителя или упълномощено от него лице, обсъждане и защита, **изготвяне на „работен проект“ (предложение).**

*\*\*\* Предвид обстоятелството, че конкретиката на мероприятията е с широк обществен характер, постигането на уникалност на визията и въздействието, предполага необходимостта всяка отделна идея и проект за настоящето събитие да е новосъздадена и едиднствена по своя характер и съдържание.*

↓ **Остойностяване на услугата** на базата на спецификация/списък на необходимата техника, технически екип, лайт дизайнери, мултимедийен контент дизайн, сценография.

*!!! На този етап, независимо от индивидуалността на събитието, което ще се обезпечават, специфичните и характерни особености на техниката и оборудването, при съблюдаване указанията на Възложителя в Публичната покана предлаганите от нас единични цени за ползване на всяко отделно оборудване ще са съобразени и няма да превишават единичните цени, оферирани в приложената количествено – стойностна сметка (приложение №2) към настоящата оферта.*

↓ **Защита на офертата**, по отношение конкретния бюджет на мероприятията и конкуренти предложения.

↓ **Осигуряване на необходимите технически средства.**

Поради наличието на ограничен технически ресурс в страната, както в количествено, така и в качествено отношение, тази част от дейността ни доскоро беше свързана с изключително големи трудности и често оскъпяваше услугата, правейки дори нерядко практически неосъществима. Така идентифицирания, стоящ до скоро пред Дружеството проблем беше преодолян, посредством одобрението за финансиране на проект на Дружеството от Оперативна програма „Конкурентоспособност на българската

икономика“. В резултат на успешното изпълнение на проекта за технологична модернизация и повишаване на конкурентноспособността на „Протехника Евент“ ЕООД придобиваме в собственост голямата и основна част от техниката и оборудването, необходими ни за осъществяване на дейността ни по техническо обезпечаване на събития и мероприятия, а именно: ново поколение професионална телевизионна осветителна техника, включваща: (1) високотехнологични роботизирани и иновативни LED базирани студийни прожектори, (2) последно поколение LED модули за изграждане на свободно конфигурируеми едроформатни LED екрани (видео стени), както и (3) програмируема мобилна система за сценична механизация.

Така придобитата в собственост изцяло нова и уникална за българския пазар техника и оборудване, в която са залегнали най-съвременните и иновативни технологии в съответните области от една страна прави Дружеството ни изключително конкурентоспособно, а от друга се постига диверсификация на дейността ни и създаване на предпоставки за съществено подобряване на качеството и нивото на предлаганите услуги и технически решения.

⚡ **Изготвяне на 3D модел, лайт дизайн, офлайн програмиране на светлинни картини** (при необходимост, в зависимост от спецификата на конкретното мероприятие), изработка на мултимедиен и видео контент (комплекс от компютърни графики и видео материали, показвани на едроформатни екраните), като за реализация на по-малки мероприятия, тази дейност може да отнеме седмици. Поради тази причина *тя се извършва предварително*, офлайн върху изготвен 3D модел на сета (съответната сцена, на която ще се изпълнява мероприятието).

⚡ **Физическа инсталация, пуск и настройка** на техниката на продукционния сет/сцена.

⚡ **Финално програмиране, репетиции, корекции**

⚡ **Работа в хода на самото мероприятие** - управление на осветление, озвучаване мултимедия (LED екрани и др., ако е необходимо), обслужване на техниката.

⚡ **Демонтаж на техниката и конструкциите за окачване** и декор, транспортиране до склада на Дружеството.

⚡ **Техническо обслужване и почистване на техниката.**

!!! Така направеното описателно представяне на организацията на работа на Дружеството по обезпечаване провеждането на събития (както техническо, така и идейно-концептуално, е представено накледно в приложената по-долу графична технологична схема на организация на работа на човешки и технически ресурс (**фигура №1**).

### ***Предвидени ресурси за изпълнение на договора***

Както вече беше посочено по-горе в направеното представяне на Дружеството, „Протехника Евент“ ЕООД е един от лидерите в областта на техническо обезпечаване на събития и мероприятия с широк обществен характер и интерес, в част художествено осветление и лайт дизайн, звук, мултимедия и сценични конструкции.

Основния си пазарен дял, дружеството търси в проекти и продукции с повишена сложност и изисквания, както по отношение на използваните технически средства, така и от гледна точка на компетентността и уменията на необходимия човешки ресурс – специалисти, осветители, лайт дизайнери, озвучители и др. Този подход изисква високо качество и професионализъм и гарантира търсенето на предоставяните услуги в дългосрочен аспект.

Безспорното предимство и конкурентоспособност на „Протехника Евент“ ЕООД се предпоставят от два основни елемента:



(1) заетите в Дружеството **висококвалифицирани специалисти с утвърдена експертиза** в подготовката и реализацията на продукции и мероприятия с широк обществен интерес;

(2) натрупания във времето богат колективен практически опит и „know how“, в следствие на своеобразния уникален характер на всяка разработена и реализирана от дружеството продукция.

Именно тези елементи правят Дружеството предпочитан партньор за клиентите в дългосрочен план, обезпечавайки трайно висок пазарен дял и устойчивост на успеха на компанията. Оценявайки важната роля на професионалната квалификацията на служителите върху пазарното позициониране на дружеството и предвид обстоятелството, че в България липсва утвърдена форма за обучение на специалисти в областите, предмет на дейност на дружеството, то със собствени средства и сили непрекъснато се стреми да повишава квалификацията на служителите си и да изгражда и образова нови кадри. Регулярно се провеждат се продуктови обучения и семинари, в страната и в чужбина както и посещения на международни тематични изложби на ново, иновативно оборудване.

Предложената от „Протехника Евент“ ЕООД организационна структура, представена графично и *видна във фигура №2* по-долу, сочи нагледно разпределението на работата по задачи и дейности и управлението, което тя изисква по отношение на персонала, квалификацията, комуникацията, връзките и процесите.

Философията и подходът на Дружеството ни е да предложи и установи сигурна организация на изпълнение на договора, независимо от характера и сложността на предстоящото за провеждане събитие, както и неговото времетраене и масов характер, включваща звена, процеси и структури, които позволяват възможно най-ефективно и успешно изпълнение във всеки конкретен случай.

В този контекст предвиждаме екип от ключови експерти, подпомагани от допълнителни технически лица, с ясно определени цели и работен план, като солидна основа, която ще сведе до минимум пречките пред комуникацията и същевременно ще максимизира качеството на изпълнението и спазването на договорните срокове и графици.

Експертите ще бъдат разпределени по отделните задачи според нуждите на последните от специфична експертиза и подкрепа (идентифицирани в началната фаза на изпълнение на договора) и в съответствие с работния план.

Всички експерти – както ключовите, така и допълнителните се намират в законово регламентирани правоотношения с Дружеството. По този начин е осигурена наличността на всички предложени от нас експерти, за целия период на договора.

#### *Управление на екипа от експерти*

Дружеството ни е обърнало специално внимание върху управлението на експертите, тъй като заданието е комплексно, колкото и идентични по характера си дейности да включва и изисква повишена степен на отговорност.

Залог за доброто изпълнение на Договора е гладката и координирана работа на екипа от експерти под ръководството на ръководителя на екипа и Управител на „Протехника Евент“ ЕООД – г-н Пламен Босев. За осигуряване на това отговорностите на допълнителните експерти ще бъдат разпределени по конкретни работни задачи. Одобрението на индивидуалните работни задания, конкретната работа по отделните задачи, в зависимост от конкретното възлагане от страна на Община Велико Търново, ще се извършват в координация и под наблюдението на Екипа за управление на договора, съставен от тримата ключови експерти, персонално посочени в представения от нас списък на техническите лица.

Освен техните преки функции и цялостна отговорност за изпълнението на всяка една дейност, ключовите експерти ще подпомогнат избора на допълнителни експерти в

съответствие с предвидените при конкретното възлагане изисквания и уточнените с отговорното лице по договора от страна на Възложителя инструменти за изпълнение на дейностите

Тъй като освен конкретна експертиза успешното изпълнение на настоящия Договор изисква от ключовите експерти и перфектни умения за работа в екип, Дружеството ни е избрало своите ключови експерти и според техните доказани умения за координиране и контролиране на екипи от различни професионалисти, както и техния достъп до групи професионалисти, които могат да бъдат мобилизирани за кратък период от време. Процесът на навременно привличане на допълнителни технически лица ще бъде подпомогнат в максимална степен от положените от ръководния екип на Дружеството ни усилия да осигури комбинирана експертиза от специфични умения, за да адресира по подходящ начин всички заявени услуги от страна на Възложителя по време на изпълнение на договора. Ако възникне необходимост от допълнителна квалификация и умения, извън тези указани в Публичната покана за настоящата оферта, ние като потенциален Изпълнител се задължаваме да осигурим подходяща експертиза, съответстваща на тези възникнали нужди.

### ***Цялостна координация и контрол на процеса и участниците в него. Мониторинг и контрол.***

#### ***Организация на работното място и работното време***

Както е известно под организация на работното място се разбира оптималното съчетание между броя на работниците, средствата на труда, материалите – за постигане на по-добро качество на доставно-монтажните дейности и техническа помощ при изпълнение на отделните мероприятия.

При организиране на работното място сме спазвали следните основни изисквания:

- правилно определяне на размерите на работния фронт и работните участъци, съобразно общата организация на мястото на работа, технологията и етапите на извършване на отделните доставно-монтажни работи.

Конкретните предложени от нас експерти с притежаваният от тях опит и професионална квалификация са детайлно посочени в представената от нас оферта.

Факторите за въздействие, които според Изпълнителя трябва да се вземат предвид с оглед успешното изпълнение на договора, са следните:

- Навременно стартиране на дейностите по договора, което ще позволи осъществяване на предвидените дейности в пълния им обхват и с необходимото качество.

- Обхватът на услугите е ясно и точно дефиниран с дейностите, описани в договора;

- Много добро сътрудничество през цялата продължителност на договора между Възложителя, Изпълнителя, всички останали изпълнители и заинтересовани страни, участващи в осъществяването на поръчката на Община Велико Търново;

- Възложителят ще определи отговорни служители, които да оказват необходимото съдействие на Изпълнителя; навременно предоставяне на информация и нейната изчерпателност, предоставяне на целия, нужен достъп за доставка и монтаж на техниката и оборудването, както и техническа помощ по време на мероприятия;

- Гъвкавост на експертите на Изпълнителя и способност бързо да реагират на възникналите потребности;

- Опит в изпълнение на идентични доставки и добрите практики от страна на експертите на Изпълнителя.

Екипът за изпълнение на настоящата поръчка е съставен от висококвалифицирани и отговорни експерти, които при изпълнение на своите ангажменти ще се ръководят и

спазват всички нормативни документи, касаещи предмета на поръчката техниката на безопасност на труда.

Въз основа на Публичната покана на Възложителя и спецификата на договора, определяме няколко свои основни принципи и предпоставки, към които ще се придържа при изпълнение на договора, ако бъде определен за изпълнител. Основен подход за успешното постигане на очакваните резултати от настоящата поръчка е принципът на партньорството.

- *Партньорство.* Дружеството ни възприема концептуалната рамка, според която всички планирани мерки ще се консултират с представители на Възложителя. Дружеството, в качеството си на евентуален изпълнител, от своя страна ще разшири партньорствата, за да събере повече мнения и гледни точки с цел успешното изпълнение на задълженията, функциите и отговорностите си по договора.

Други подходи, които като евентуален Изпълнител ще използваме за успешното изпълнение на дейностите по договора и с цел подобрене управлението на процесите на ниво договор са:

- *Осигуряване на високо квалифициран и подготвен екип за изпълнение на задачите.* Екипът от експерти, които са подбрани, притежава едновременно експертизата и опита в извършването на подобни дейности. Експертите на Изпълнителя ще бъдат снабдени с всички ресурси, за да осъществяват дейността си мотивирано. Притежаваните от екипа на „Протехника Евент“ ЕООД опит и практика, както и резултатите от работата на Изпълнител по други проекти, са основа за прилагане на специфични и иновативни подходи и методи, които са изградени и тествани при изпълнение на предходни задачи, за изпълнение на отделните дейности по поръчката.

- *Възприемане на изискванията на Възложителя и действащото законодателство.* В случай, че Дружеството бъде избрано за изпълнител, ще се води от гледната точка на Възложителя относно цялостната концептуална рамка за изпълнение на заложените дейности. Целта на Дружеството ни ще бъде постигане на гъвкавост и мобилност при изпълнение на предвидените в Публичната покана и доразвити в настоящата техническа оферта дейности, които ще бъдат изпълнявани след консултации с Възложителя и неговото предварително одобрение и съгласие.

- *Недопускане на конфликт на интереси.* Спазване на принципите за недопускане на конфликт на интереси. Изпълнителят ще предприеме всички необходими мерки, за да предотврати или прекрати всяка ситуация, която може да компрометира независимото и обективно изпълнение на договора и ще следи за спазването на принципите и правилата за етично поведение от всички членове на екипа.

- Запознати сме с обстоятелството, че Възложителят си запазва правото да се увери, че тези мерки са адекватни и може да изиска предприемането на допълнителни мерки, ако това е необходимо. Изпълнителят трябва да направи така, че неговите служители, включително и ръководните кадри, не са поставени в ситуация, която може да доведе до конфликт на интереси. Той се задължава да смени, незабавно и без компенсация от Възложителя, всеки свой служител, който е изложен на такава ситуация.

- Изпълнителят трябва да се въздържа от всякакви контакти, които биха компрометирали неговата независимост, или независимостта на персонала му. В противен случай. Възложителят може да прекрати договора.

- Изпълнителят трябва да ограничи ролята си по поръчката само по отношение на предоставянето на договорените услуги.

- Изпълнителят и всяко лице, което работи под неговите правомощия и контрол по изпълнението на договора, няма право да приема друго плащане по договора, освен предвиденото в същия договор.

Като приложение на настоящето прилагаме структурна и технологична схема на представяването от мен Дружество.



Цялостната координация и контрола на процеса и участниците в него, както и вътрешния контрол са от важно значение за успешното и качествено изпълнение на дейностите, с оглед адекватното постигане на целите и резултатите по договора, а и на всяко отделно мероприятие, обезпечаването и техническото обслужване на което ще бъде предмет на допълнително възлагане. Той ще продължи през целия период на изпълнение и ще принадлежи като функция и отговорност Дружеството ни като изпълнител на договорните задачи и дейности. Той ще се осъществява чрез наблюдение и вътрешна оценка, провеждането на ежеседмични, а когато е необходимо и ежедневни срещи с членовете на екипа, обсъждане на графика на дейностите, хода на изпълнението им за всеки конкретен експерт, допуснати грешки, трудности, проблеми със спазване на сроковете или възникнали от друго естество.

Така ще се осъществява своевременното управление на дейностите, ще има ясна проследимост на процеса на постигането на резултатите, с цел диагностициране на проблемните области, отстраняването на конкретни грешки и оценка на напредъка. Експертите ще бъдат длъжни да информират ръководителя на екипа за дейностите, които са извършили на всеки конкретен етап за целия срок на изпълнение на поръчката. Вътрешната отчетност ще осигури адекватност на планирането и реализирането на всички активности и ресурси, ще даде проследимост на процесите от страна както на Дружеството, така и на Възложителя.

Опитът ни в годините показва, че вътрешният контрол на качеството е от ключово значение за постигане на целите, които си поставя настоящият договор. Качеството на работата на експертите ще бъде следено чрез вътрешен контрол за качество на три нива:

- на ниво Дружество,
- на административно ниво,
- на техническо ниво.

На ниво Дружество контролът ще се осъществява от ръководителя на екипа – г-н Босев. Той ще контролира работата на всички членове на експертния екип, включително и на допълнителните технически лица, включени в изпълнението на всяка отделна, възложена от Община Велико Търново дейност, в рамките на договора за изпълнение.

На административно и на техническо ниво контролът на качеството ще бъде осъществяван от предложениите ключови експерти, които ще отговарят като цяло за качеството на отделните дейности, както и за спазването на графика за изпълнение на настоящето мероприятие.

Всички служители на Дружеството ни, както и ангажираните за целите на настоящата поръчка експерти са предварително запознати с принципите и се задължават да спазват установените правила за управление и контрол. Прилаганата от нас система за вътрешен контрол намалява:

- възможността за лоша преценка при вземането на решения,
- човешки грешки,
- умишлено заобикаляне на установени процедури,
- неефективното управление и контрол,
- неприлагането на утвърдени правила за реакция при възникване на непредвидени обстоятелства.

#### ***Методи, гарантиращи качествено изпълнение.***

Цялостната дейност, която „Протехника Евент“ ЕООД развива, е подчинена на единен подход и обща методология по изпълнението на проекти, договори и споразумения с контрагенти и Възложители. Основен елемент от нашия подход е уважението към

спецификата на институцията-възложител/клиент – на всяко от нивата, на които функционират, заинтересованите в изпълнението на услугата организации.

Действията ни са насочени към постигане на траен и устойчив резултат, както и към ефективно, активно въвличане в изпълнението на услугата на всички заинтересовани лица, имащи отношение към конкретното събитие, както и стимулиране на ползвателите на ефектите и резултатите от мероприятиято, за активно участие в конкретните дейности.

За изпълнение на предвидените дейности Дружеството ни ще приложи интегриран подход, който осигурява както третирането на всяка отделна дейност като самостоятелен комплекс от действия с ясно измерими конкретни резултати, така и логическото свързване на дейностите по начин, че изпълнението на всяка от тях да улеснява извършването на следващите и да надгражда резултатите от предишните.

Този подход ще гарантира както постигането на целите на договора, така и текущото и периодично проследяване на напредъка от гледна точка на вътрешната система за самоконтрол на Дружеството и от Възложителя.

В хода на изпълнение на договора екипът ни ще стъпи на богатия си опит при осъществяване на техническо обезпечаване и обслужване на мероприятия, при изпълнение на сходни по мащаб договори.

Един от най-важните аспекти на настоящата поръчка е координацията и управлението на комплекс от дейности, специфичните и характерни особености на които не са предварително специфицирани от Възложителя и са до голяма степен неясни към момента, което от своя страна предполага голям брой отговорни дейности, които следва да бъдат интегрирани чрез добре контролиран процес. Ефективното управление на договора пък от своя страна има ключова роля за крайния успех. През годините и в хода на своята работа експертите на Дружеството ни са разработили съответни методи и умения за управление на договорни задачи с неопределена и априорно неясна спецификация, както и за работа в „екстремни“ и „спешни“ ситуации. Всички наши експерти са твърдо убедени, че методологичният подход към договорното управление е от жизнено важно значение за успешното приключване на всяко едно събитие, а принципите ни на работа са ефективни и са проверени на практика в изпълнението на други договори.

Съобразно споделяната от „Протехника Евент“ ЕООД визия за реализация на дейностите от обхвата на обществената поръчка, изпълнението е разделено на последователни етапи, всеки със срок за изпълнение на съответните задачи. Тъй като всеки етап се изгражда на база на предишния, навременното изпълнение на задачите и дейностите е задължително, за да може да се премине към следващия етап (фаза). Предложените от нас Ключови експерти ще вземат решенията за преминаване към следващата фаза. В началото на всеки етап основните предположения и рискове ще се преценяват и оценяват отново.

За успешното управление на всеки договор, независимо от неговия предмет и специфика, е необходимо да има система. Завършената система за управление на договора се състои от няколко компонента (подсистеми), както е показано по-долу:

➤ Под-система „Човешки фактор“. В основата на системата е под-системата на човешкия фактор, с което се подчертава, че всички останали под-системи зависят от подкрепата на този компонент. За да успее, един ръководител на екип трябва да владее всички елементи на под-системата, които включват:

- Лидерство;
- Водене на преговори;
- Изграждане на екип;
- Мотивация;
- Комуникация;
- Вземане на решения.

➤ Подсистема „Методи“. Методите касаят предложените инструменти /до договора.

➤ Подсистема „*Организация*”. Трябва да определи заданието и да се дефинират правомощията, отговорностите и отчетността на всеки отделен член.

➤ Подсистема „*Планиране*”. Доброто договорно планиране е от съществено значение за успеха. Всяка организация се нуждае от добра методология за планиране на договори.

➤ Подсистема „*Информация*”. Наличието на добра информация от минали и сегашни периоди е от решаващо значение за правилното планиране на работата по договора.

➤ Подсистема „*Контрол*”. Контролната под-система е подкрепена от под-системите за планиране и информация.

Извлечено от опита на Дружеството, ние използваме класически подход за изпълнение на договори по подобни договори, който включва *следните етапи*:

### ***Етап 1: Стартиране на изпълнението на договора и планиране***

Дейност 1.1. Подписване на договор за изпълнение с Възложителя и получаване на възлагателно писмо и предоставяне на техническо лице от страна на Възложителя, за съгласуване и съдействие при изпълнение на мероприятията, с право за вземане на оперативни решения.

Дейност 1.2. Екип за изпълнението и управлението на договора.

1.2.1. Поставяне на задачите на екипа от експерти (извършващи основните действия по параметризиране, настройка, управление на доставката, тестове, демонстрации и обслужване на събитието).

1.2.2. Поставяне на задачите на изпълнителски състав (извършващ монтажни дейности на техниката и оборудването, под ръководството на съответния експерт, отговорен за вида дейност).

Дейност 1.3. Планиране и координация на етапите, задачите, рисковете, контрол за спазване на изискванията, докладване на резултатите.

### ***Етап 2: Доставка и монтаж на оборудването***

Дейност 2.1. Доставка на оборудването до обекта

2.1.1. Изготвяне на график за доставка и организиране на доставката

2.1.2. Съгласуване с Възложителя място за съхранение на оборудването до неговото същинско монтиране (ако времето за изпълнение е по-продължително и се налага съхранение)

2.1.3. Транспортиране на изпълнителните устройства на отделните системи на местата определени за монтаж на същите.

2.1.4. Проследяване и контрол.

Дейност 2.2. Монтаж, пуск и настройка на съответната система

2.2.1. Извършване на оглед и маркиране на местата за монтаж

2.2.2. Инструктаж за начина на монтаж и безопасност

2.2.3. Монтаж – механичен съгласно индивидуалните изисквания и упътвания

2.2.4. Монтаж – електрически, при който се извършва свързването на всички управляващи и захранващи кабели и съединители съгласно принципните електрически схеми и инструкции без подаване на захранващо напрежение.

2.2.5. Проследяване и контрол



2.2.6. Тестване на отделните захранвания на площадката и проверка на сертификатите и параметрите на същите (табла, предпазители, дефектнотокови защиты и др.)

2.2.7. Поетапно включване на отделните захранвания и извършване на необходимите измервания и тестове на отделните системи с мобилни управления с цел постигане на зададените предварително параметри.

2.2.8. Тестване на системите и настройки на същите за привеждането им в работен режим.

2.2.9. Окончателен тест и настройка на съответната система.

2.2.10. Проследяване и контрол

*!!! С цел повишаване качеството и ефективността на изпълнението и постигане на крайната цел от провеждане на шоуто по случай празника на гр. Велико Търново, предвид наличието на обективни към датата на изготвяне на настоящето предложение обстоятелства, изразяващи се в нетипични за периода неблагоприятни метеорологични условия с обилен снеговалеж и снегонавлъвания, бихме искали да предложим следните условия по изпълнението, които считаме за логично да бъдат спазени и съобразени от страните по договора, в хипотеза на продължаващо и към периода, определен за провеждане на подготовка и провеждане на събитието „бедствено положение“, а именно:*

*1. При наличие на температура на въздуха под 1° C (градус по Целзий) и/или пориви на вятъра над 50км/ч и/или валежи (независимо от техния вид и интензитет), в периода до три дни преди определената дата за провеждане на събитието, Изпълнителят ще има право да не започне монтажа на конструкциите и оборудването за осветление и озвучаване.*

*2. В хипотеза на аналогична ситуация, от гледна точка неблагоприятност на атмосферните условия, като: температура на въздуха под 1° C (градус по Целзий) и/или пориви на вятъра над 50км/ч и/или мъгла и/или валежи (независимо от техния вид и интензитет), Изпълнителят ще има право да не започне или да прекрати излъчването на шоуто.*

*3. Възложителят има право да откаже проявата 7 (седем) дни преди датата ѝ за изпълнение, в случай, че метеорологичната прогноза включва един или повече от неблагоприятните фактори, упоменати в предходните два абзаца, като ще дължи на Изпълнителя стойността на извършените до момента разходи.*

*4. Възложителят има право да пренасрочи проявата за деня преди или след първоначално обявената дата до 7 (седем) дни преди нея, в случай че метеорологичната прогноза включва някой от неблагоприятните фактори, изброени в т.1. и т.2 по-горе. Определянето на нова дата и пренасрочване провеждането на събитието следва да бъде обективизирано в писмено допълнително споразумение (анекс) към договора за възлагане на изпълнението.*

*5. В случай че метеорологичната прогноза включва един или повече от неблагоприятните фактори, изброени в хипотезите на т.1 и т.2 на настоящето предложение, Възложителят ще има право да пренасрочи проявата за деня преди първоначално обявената дата до 3 (три) дни преди нея, като това пренасрочване води до допълнително заплащане на услугата, в размер мин. 50% от стойността по*

основния договор, подлежащо на допълнителна договорка между двете страни и отразено в писмен текст.

6. В случай на събждане на хипотезата, предвидена в предходната точка и междувременно заетост на техниката и екипа, предвидени за обезпечаване на събитието, изпълнителят ще има право да откаже промени в датата на проявата.

### **Етап 3: Същинско провеждане на конкретното събитие**

3.1.1. Управление на осветление, озвучаване мултимедия (LED екрани и др., ако е необходимо), обслужване на техниката.

**Етап 4: Демонтаж на техниката и конструкциите за окачване**, транспортиране до склада на Дружеството.

### **Рискове и допускания при изпълнение на договора**

Управление на риска се нарича систематичният подход за намирането на най-доброто поведение в условията на неопределеност чрез идентифициране, разбиране, оценка, предприемане на действия и комуникиране на информация за рисковата ситуация. Управлението на риска включва организационната култура, управленските процеси и организационните структури, които служат за ефективно управление по посока на използване на възникващите потенциални възможности и/или на избягване на неблагоприятните последици.

Всяка дейност съдържа риск, който се нарича присъщ риск. Целта на управлението на риска е да намали вероятността от настъпването на потенциалното събитие и неговото негативно влияние. Намалването на вероятността и влиянието се постига чрез избор на подходящи реакции на риска. След предприемане на конкретни действия (реакция на риска) продължава да съществува риск, който се нарича остатъчен риск и по същество изразява факта, че рискът не може да бъде премахнат изцяло.

Управлението на риска е динамичен процес, съобразен със стратегическите и оперативните цели, и е част от цялостното управление на организацията. Той трябва да се осъществява от всички нейни йерархични нива (структури и разпоредители с бюджетни кредити от по-ниска степен).

Управлението на риска е насочено към установяване, определяне (количествено и качествено), контролиране и елиминиране (при възможност) на значимите рискове, които могат да изложат на опасност успешното завършване на договора.

Основните стъпки, включени в процеса на управление на риска са:

- идентифициране на потенциалните рискови области, източници на риск;
- оценяване на вероятността и влиянието, които могат да имат тези рискове;
- съставяне на план за управление на риска за съществените рискове;
- наблюдение на рисковите области;
- предвиждане на действия за ограничаване на влиянието (когато е необходимо);
- периодична преоценка на рисковете.

Целта на управлението на риска е да се идентифицира всеки съществен риск, който може да повлияе на договора, да се оцени този риск, да се препоръча действие и да се определи отговорността за разрешаването му. Управлението на риска подпомага създаването на предварителна предупредителна система за рисковете, които могат да се появят и стимулира генерирането на пропоръчителни мерки за минимизиране на влиянието върху постигането на целите на договора.

Рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху постигане целите на договора са основно свързани с ангажираността на Възложителя, състоянието на нормативната уредба, разминаването с целите на договора.

На базата на опита при изпълнението на проекти със сходен предмет, „Протехника Евент“ ЕООД ще предложи, с цел навременното идентифициране на рисковете по договора, да се разработи План за управление на риска, както и методика за неговото управление. След възлагането на обществената поръчка, ако Възложителят приеме поддържането на такъв план за управление на рисковете, ще бъдат дефинирани останалите рискове с описание, оценка (в съответствие с въздействието върху изпълнението), препоръчително противодействие и определяне на отговорните служители, които следва да изпълнят тези действия.

В случай че Възложителят приеме този подход, Планът за управление на риска, ще бъде непрекъснато обновяван, в зависимост от конкретиката на всяко мероприятие, като рисковете ще се преоценяват по отношение на тяхното влияние върху договора, ще се добавят нови или ще се премахват рискове, които са елиминирани. Ще предложим поддържането на Плана за управление на риска да е задача на определеният от нас Ръководител на екипа – г-н Пламен Босев, през целия жизнен цикъл на изпълнение на договора, като действията, които следва да се предприемат за смекчаването им, ще бъдат решавани на оперативно ниво.

#### ***Ключови моменти и допускания, свързани с постигането на целите на договора и очакваните резултати***

В секцията по-долу дефинираме основните ключови моменти, *базирани и на посочените в Публичната покана на Възложителя допускания*, влияещи върху качествено и ефективно изпълнение на поставените задачи.

#### ***Ключов момент 1 – Добро сътрудничество и комуникация с Възложителя. Активно съдействие от ръководството и експертите на Община Велико Търново.***

Пълната мобилизация на голям екип експерти, техника и обучен екип за работа с тази техника сама по себе си не е достатъчна за успешното изпълнение на договора в заложения обем дейности и срок. Необходимо е Възложителя да осигури пълно съдействие на екипа ни по отношение на:

- Определяне на оптимални срокове за отговор на кореспонденция и изготвяне на коментари към спецификата на оборудването, необходимо за обезпечаване на мероприятието;
- Наличността на експертите от администрацията, отговорни за различните етапи от изпълнение на договора
- Осигуряване на пълен и безпрепятствен достъп до местата, на които ще бъде доставяна и монтирана техниката и оборудването.

Това сътрудничество е задължителна предпоставка за успешното изпълнение на договора.

Вярваме, че с цел улесняване на работата на експертите ни, ръководството на Община Велико Търново ще извърши необходимата предварителна подготовка за работата като определи съответните експерти, които да сътрудничат на екипа ни дори и преди стартиране на договора. От своя страна ние ще предложим и съобразим с натовареността на експертите от Общината графика за изпълнение на мероприятията.

#### ***Ключов момент 2 – Отделните продукти и оборудване задължително ще се съгласува предварително с експерти от Общината.***



За ефективното изпълнение на договора и за прилагане на принципите на целесъобразност и качество на изпълнението, всяко едно мероприятие ще бъде извършвано доставка, монтаж и техническо обезпечаване, съгласно конкретните потребности на Възложителя.

*Независимо от това, в рискове, сме отбелязали потенциалната опасност от неангажирано поведение и отсъствие на съдействие от страна на заинтересованите страни.*

***Рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора***

В Публичната покана са описани ясно целите, предмета и индикативните етапи на настоящата обществена поръчка, както и изискванията на Възложителя, което е предпоставка за извършване на предварителна оценка на риска и предприемане на релевантни мерки за неговото минимизиране от страна на Изпълнителя. Богатият опит, който Дружеството ни притежава в изпълнение на услуги от такъв мащаб, също е предпоставка за намаляване на степента на риск, както и за предприемане на навременни превантивни действия за избягване на рискови ситуации, които могат евентуално да окажат негативно влияние върху изпълнението на поръчката на Община Велико Търново.

Предвид изложеното, още на етап подготовка на офертата, експертите на “Протехника Евент“ ЕООД направиха предварително обстоен анализ на риска и набелязаха съответните мерки за неговото минимизиране. Бяха идентифицирани долуописаните допускания и рискове.

В процеса на реализация на отделните дейности в пълния договорен цикъл съществува вероятност за възникване на събития и действия, потенциално оказващи негативно влияние върху изпълнението на поръчката. Предварителното идентифициране на основните рискове при реализация му и подходите и методите, а също и мерките за тяхното ранно откриване и предотвратяване е ключов фактор за успешното изпълнение и отчитане на дейностите на ниво изпълнение на настоящия договор.

Описаните по-долу рискове са разграничени съгласно вида на факторите за въздействие като са посочени кои могат да бъдат определени като вътрешни и кои като външни фактори, както и е дадена кратка обосновка относно възможността за въздействие върху тези фактори.

По-долу в табличен вид са представени основните видове потенциални рискове, вероятността за тяхното проявление, техният ефект, подходът и методиката за превенция/преодоляване/управление на риска, препоръчителните действия /корективни мерки (превантивни и корективни), както и типа рисков фактор, оказващ неблагоприятно въздействие (външен или вътрешен), както следва:

Риск	Вероятност	Ефект	Значение и подход за преодоляване на риска	Препоръчителни действия/мерки	Фактори за въздействие
Затруднена комуникация с някои от заинтересованите страни по поръчката (най-вече външни изпълнители)	Средна	Среден	Информирание на всички заинтересовани страни от страна на Възложителя относно дейностите по договора веднага след стартирането му. Ясни комуникационни канали, установени	<b>Превантивни:</b> Подкрепа от страна на екипа на Възложителя	Комбинация между външни и вътрешни фактори на средата



Риск	Вероятност	Ефект	Значение и подход за преодоляване на риска	Препоръчителни действия/мерки	Фактори за въздействие
			в писмена форма със самия старт на договора.		
Недостатъчно бързо вземане на оторизирани решения от страна на различните страни в процеса на работа	Средна	Среден / висок	Ясни комуникационни канали, установени в писмена форма със самия старт на договора; ясни ангажименти на страните; екипно изпълнение на съвместен план-график.	<b>Превантивни:</b> Всички лица са напълно ангажирани с проблема, следват графика за изпълнение на договора и оказват пълно съдействие за преодоляване на евентуални проблеми в процеса на комуникация.	Вътрешни и в по-малка степен външни
Промени в предварителните условия на проекта по време на изпълнението на настоящите технически спецификации	Ниска	Висок	Важността на навременното завършване на услугите, които ще се изпълняват по този проект е добре осъзната, тъй като тези дейности са ключа към целесъобразното и правилно изпълнение на целия проект. Следователно „Протехника Евент“ ЕООД ще приложи своята вътрешна система за управление на качеството и строго ще следи прогреса в изпълнението на доставките спрямо зададените крайни срокове.	<b>Превантивни:</b> Постоянното управление на риска ще идентифицира навреме всеки потенциален проблем и ще бъдат разработени подходящите процедури за смекчаване	Вътрешни и в по-малка степен външни
Недостатъчно събрана първоначална информация за местоизпълнението или характера на събитието	Средна	Висок	Внимателно уточняване на източниците на информация и очаквания обхват на информация от всеки източник; Допълнителен анализ на източниците и	<b>Превантивни:</b> Оценка на обхвата на информацията от повече от един експерт. Участие на ключовите и не-ключови експерти в процеса на събиране на	Външни и в по-малка степен вътрешни

Риск	Вероятност	Ефект	Значение и подход за преодоляване на риска	Препоръчителни действия/мерки	Фактори за въздействие
			информацията след провеждане на разговори (включително писмена кореспонденция) с всички заинтересовани страни	информацията. Предварително разработване на структурата на свързаните документи.	
Ненавременно събиране и получаване на първични данни	Средна	Среден	Внимателно и подробно планиране на дейностите по доставка и гъвкавост в сроковете за планиране на под-дейностите.	<b>Превантивни:</b> Текущ мониторинг и контрол на напредъка на работата по изпълнението	Вътрешни и в по-малка степен външни
Труден достъп до местата за доставка и монтаж на техниката	Ниска	Висок	Бързият и непрекъснат достъп до местата за доставка и монтажа е важно условие за ефективното изпълнение на договора.	<b>Превантивни:</b> Текущ мониторинг и контрол на напредъка на работата по изпълнението	Външни
Недобра комуникация между експертите	Ниска	Среден	Ясно и точно разпределение на дейностите и под-дейностите между експертите и сроковете за изпълнение на всяка дейност.	<b>Превантивни:</b> Редовни срещи между експертите за анализ на напредъка и планиране на последващите дейности.	Вътрешни
Множество страни, участващи в процеса на изпълнение на договора	Ниска	Висок	Ясно и точно разпределение на дейностите и под-дейностите между отделните участници. Осъществяване на проверки на работата на отделните изпълнители по договорите и своевременно предупреждаване на Възложителя с предложение за конкретно действие.	<b>Превантивни:</b> Редовни срещи между основните участници, проверка на изпълнението на извършената работа и планиране на последващите дейности.	Главно външни



Риск	Вероятност	Ефект	Значение и подход за преодоляване на риска	Препоръчителни действия/мерки	Фактори за въздействие
<i>Забавяне в плащанията по договора</i>	Средна	Среден	Дружеството ни се ползва с кредитно доверие на финансовите институции при забавяне на плащанията по договора е в състояние да покрие разходите по услугата, при наличие на реални обективни причини за забавянето.	<b>Корективни:</b> Подготовка на официална кореспонденция в тази връзка с Възложителя	Външни

Превенцията/управлението на риска, което Дружеството ни ще прилага, при евентуалното му избиране за изпълнител на договора, е насочено към установяване, определяне (количествено и качествено), контролиране и елиминиране (при възможност) на значимите рискове, които могат да изложат на опасност дейностите по договора, а от тук и успешното изпълнение на договорните дейности и реализирането на поръчката като цяло.

Целта на превенцията/управлението на риска от страна на експертите на Дружеството е да се идентифицира всеки съществен риск, който може да повлияе на изпълнението на договора, съответно върху реализирането на поръчката на Община Велико Търново, да се оцени този риск, да се препоръча действие и да се определи отговорността за разрешаването му. Управлението на риска подпомага създаването на предварителна предупредителна система за рисковете, които биха могли да се появят и стимулира генерирането на препоръчителни мерки за минимизиране на влиянието върху постигането на целите на договора.


Основавайки се на дългогодишния си опит в проектирането, изграждането, интегрирането и техническо обезпечаване на професионални системи за озвучаване, осветление и мултимедия, ние предварително сме подготвили оптимални решения и подходи към монтажа, интегрирането и техническа помощ на всяка една от обособените системи, предмет на поръчката.

Резултатите от нашите предварителни проучвания показват, че са налице всички предпоставки и съществува реална техническа възможност монтажът и техническата помощ да бъде извършен качествено и в срок.


Дата: 10.03.2015 г.

Подпис и печат: .....

(Пламен Босев)

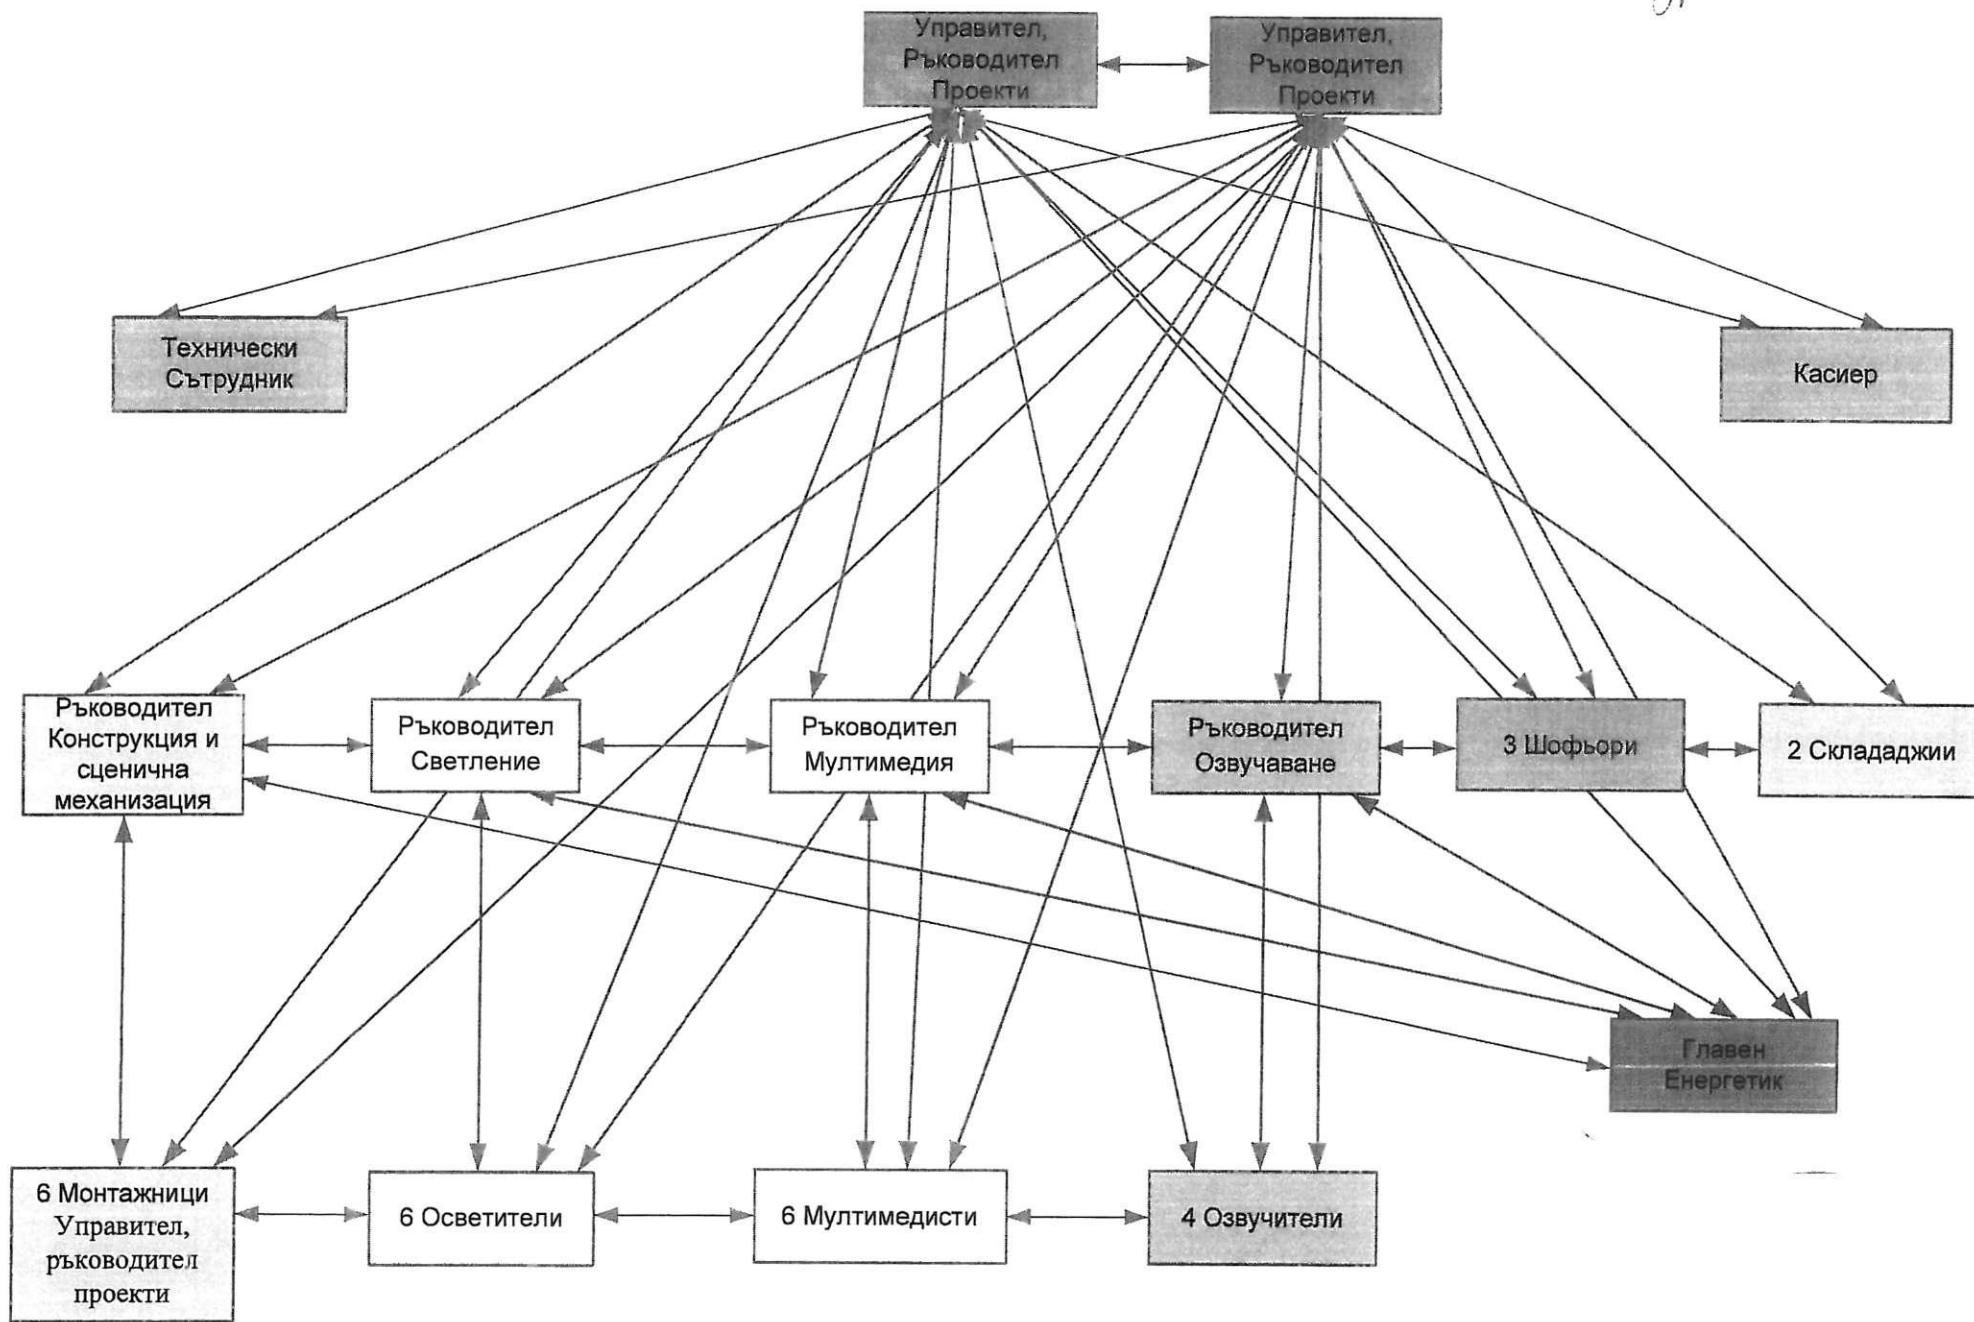



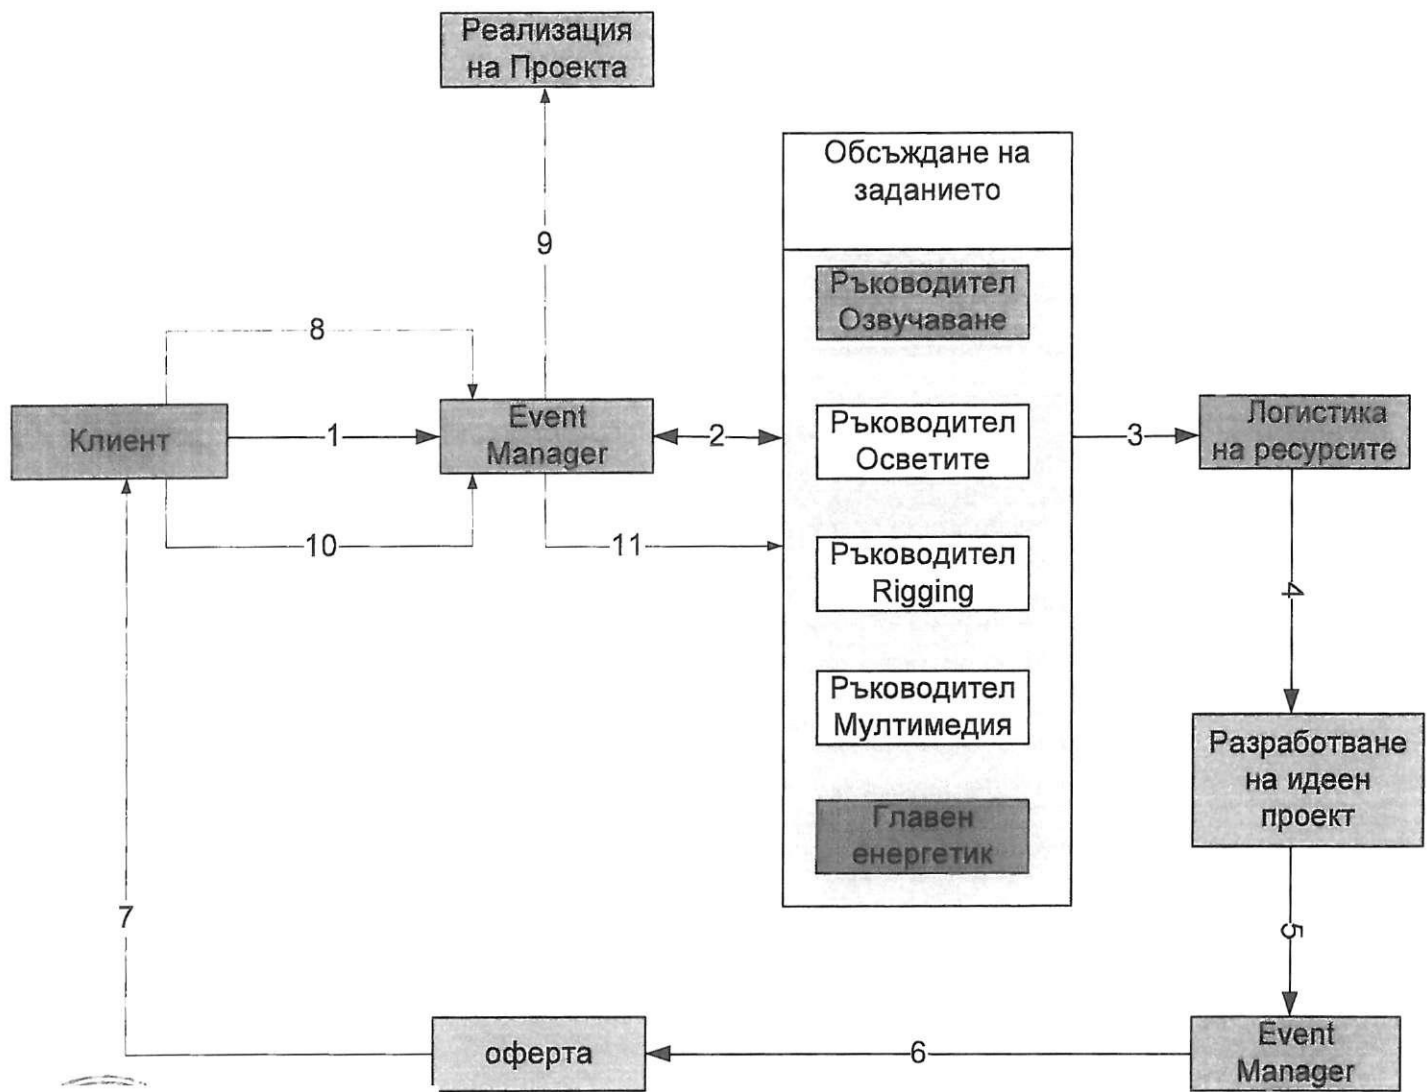

Вариант 2

1. Запитване от клиент
2. Обсъждане на заданието с екипа
3. Логистика на ресурсите
4. Разработване на идеен проект с екипа, при необходимост и с подизпълнители
5. Финализиране идеен проект и стиковка на ресурсите
6. Изготвяне оферта
7. Представяне на проект и оферта
8. Потвърждение на проекта (при корекции от страна на клиента стъпките от 2 до 8 се повтарят)
9. Реализация на проекта
10. Обратна връзка от клиента за "+" и "-" в работата
11. Разбор на крайните резултати с екипа

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За обществена поръчка с предмет: „Услуга по проектиране на триизмерна проекция - 3D мапинг спектакъл „Величието на Асеневици“ в района на „Паметник Асеневици“ и върху сградата на ХГ „Борис Денев“

От: **ПРОТЕХНИКА ЕВЕНТ“ ЕООД**

С адрес за кореспонденция : град София, бул. ”Искърско шосе” № 7, Търговски център „Европа”, бизнес сграда № 10; п.к. 1528

Тел.: 0888/60 67 44, e-mail: [protechnicaevent@gmail.com](mailto:protechnicaevent@gmail.com),

ЕИК: 131057484

Регистрация по ЗДДС: **BG131057484**

Разплащателна сметка: .

IBAN сметка: .

ВІС код на банката: .

Банка: **Банка „ДСК“ ЕАД**

Град/клон/офис: **София**

Адрес на банката: ул. „Цар Калоян“ №1

### **УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,**

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената чрез публична покана обществена поръчка с предмет: „Услуга по проектиране на триизмерна проекция - 3D мапинг спектакъл „Величието на Асеневици“ в района на „Паметник Асеневици“ и върху сградата на ХГ „Борис Денев“

Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поемаме ангажимент да изпълним задачата в срок.

1. **Начин на плащане:** по банков път, с платежно нареждане в български лева по следната банкова сметка **IBAN:** .

2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури.

3. Предлагаме **възнаграждение за изпълнение на поръчката**, както следва: **65 903 лв. (шестдесет и пет хиляди деветстотин и три лева), без ДДС или 79 083,60 лв. (седемдесет и девет хиляди осемдесет и три лева и шестдесет стотинки), с ДДС.**

За изпълнението на поръчката се нуждаем от **аванс в размер на 30 % (тридесет процента)** от общата стойност на поръчката.

Срок за окончателно плащане: *до 30 (тридесет) дни след одобряване на фактурата.*

4. Приложима валута и зачитане при несъответствие: *цените са в български лева без ДДС.* При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема предвид изписаното с думи.

Посоченото възнаграждение включва *предоставените авторски права със съдържание съгласно представен проект на договор от Възложителя, както и стойността за изпълнение на цялостната услуга по прожектиране на триизмерната проекция, в което число: светлино, лазерно шоу чрез прожектиране, анимация, цената на ползваната специализирана техника, транспортирането ѝ Франко мястото на изпълнение и възнаграждението на експертите, ангажирани в изпълнението на услугата.*

Дата: 10.03.2015 г.

Подпис и печат: .....

(Пламен Босев)
